



CIRCULAIR RAPPORT

Project: MBO College West Adam

Projectadres: Laan van Spartaan Adam



Datum: 28-10-2025

Versie: 1.2

Opsteller: G Foekens

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1. Achtergrond.....	3
1.2. Toepassingsgebied en Doelstelling	4
1.3 Algemene eisen	4
1.4 10R Model	8
1.5 Circulaire Deal Secundaire bouwmaterialen Noord Holland Noord	9
2 Behandeling en afvoer sloopmaterialen	12
Systeemplafonds	12
Randafwerking systeemplafonds	15
Luchtroosters plafond	18
Plafondverlichting	20
Verhoogde vloer	22
Bestaande balie	25
Rachelwerk en beplating verwijderen	29
Brandblussers / brandslangen	31
Schoonloopmat	33
Vinylvloer	35
Systeemwanden	37
Puien en kozijnen	40
Diverse bevestigingsmiddelen	44
Radiatoren	46
Kastenwanden	48
Metalen omranding	51
3 Certificaat Circulaire Sloopproject.....	53
4 Stoffenverantwoording	54

1. INLEIDING

1.1. Achtergrond

MBO College West (ROCvA) – leren in de stad

Aan de Laan van Spartaan is ook **MBO College West** gevestigd, onderdeel van het **ROCvA** (Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam).

- **Opleidingen**

Het college biedt een breed scala aan opleidingen, o.a. in de richtingen:

- Zorg & Welzijn
- Economie & Administratie
- ICT
- Horeca, Toerisme & Facilitair
- Sport & Bewegen

- **Modern gebouw**

Het schoolgebouw is modern, ruim opgezet en ingericht om praktijkgericht onderwijs te ondersteunen. Studenten leren er in praktijklokalen, keukens, sportzalen en simulatieomgevingen.

- **Samenwerking met de buurt**

MBO College West werkt nauw samen met bedrijven en organisaties in de omgeving. Studenten lopen stages bij lokale zorginstellingen, horeca en sportverenigingen. Ook zijn er regelmatig buurtactiviteiten en evenementen op de Laan van Spartaan.

1.2. Toepassingsgebied en Doelstelling

Het project betreft de **renovatiesloop van een deel van het gebouw van MBO College West aan de Laan van Spartaan**. Binnen dit project zijn bouw- en afbouwmaterialen zorgvuldig gedemonteerd met als doel deze hoogwaardig terug te brengen in de keten.

- **Object:** MBO College West – Laan van Spartaan, Amsterdam
- **Type werkzaamheden:** Renovatiesloop met oog voor circulaire demontage
- **Uitvoering:** Selectief, met registratie van materiaalstromen en borging via circulaire principes

1.3 Algemene eisen

Foekens sloopcombinatie is VCA ** gecertificeerd en SVMS007 en voldoet aan de algemene eisen pagina 6 van 38 Beoordelingsrichtlijn veilig en milieukundig slopen versie 17-01. 1.3 Algemene eisen.



Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
www.normeccertification.nl



VCA** Systeemcertificaat EC-VCA-20339

Normec Certification B.V. verklaart hierbij op basis van het certificatieonderzoek dat het veiligheidsbeheerssysteem van:

Foekens Sloopcombinatie B.V.

Vestigingslocatie(s):

Sluispolderweg 27, Zaandam

Voldoet aan de eisen gesteld in:

VGM Checklist Aannemers, VCA 2017/6.0**

Voor het toepassingsgebied:

Nederlands: Het uitvoeren van sloopwerken.

NACE code: F.43.11



Datum uitgifte : 24-07-2024
Geldig tot : 24-07-2027
Gecertificeerd sinds : 26-10-1995




W.L. Princen

Normec Certification B.V. zal gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uitvoeren.

SAFETY CULTURE LADDER

SCL CERTIFICAAT



Foekens Sloopcombinatie B.V.

CERTIFICAAT NR:

NC-SCL-0076

DIT TER BEVESTIGING DAT:

Foekens Sloopcombinatie B.V.

Sluispolderweg 27

1505 HJ ZAANDAM

MET KVK NUMMER:

35023017

VOLGENS DE EISEN GESTELD IN DE NORM:

Certificatieschema Safety Culture Ladder versie 2.0 d.d. 01-09-2023

TREDE 3 BEHAALD HEEFT VOOR TOEPASSINGSGBIED:

Het slopen van gebouwen en objecten.

DIT CERTIFICAAT IS UITGEGEVEN OP:

21-04-2025

DEZE ORGANISATIE IS GECERTIFICEERD SINDS:

21-04-2022

DIT CERTIFICAAT IS GELDIG TOT:

21-04-2028

BEOORDELING UITGEVOERD ONDER LEIDING VAN:

D. Vis

Lead-Auditor

NAMENS: Normec Certification B.V.

W.L. Princen

Operationeel Manager

Normec Certification B.V., Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen, 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com, www.normeccertification.nl



SAFETY CULTURE LADDER

NEN



Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
www.normeccertification.nl



Normec

ISO 9001 Systeemcertificaat EC-KWA-01481

Normec Certification B.V. verklaart hierbij op basis van het certificatieonderzoek dat het kwaliteitsmanagementsysteem van:

Foekens Sloopcombinatie B.V.

Vestigingslocatie(s):

Sluispolderweg 27, Zaandam

Voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

NEN-EN-ISO 9001:2015

Voor het toepassingsgebied:

Het slopen van gebouwen en objecten.




Datum uitgifte : 09-06-2024
Geldig tot : 09-06-2027
Gecertificeerd sinds : 09-06-2015


W.L. Princen

Normec Certification B.V. zal gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uitvoeren.

1.4 10R Model

Voor het circulair slopen zal er gebruik worden gemaakt van het 10R Model. Hoe hoger gescoord wordt hoe beter het voor het milieu is. De maximale score die behaald kan worden voor de sloop is een 7.

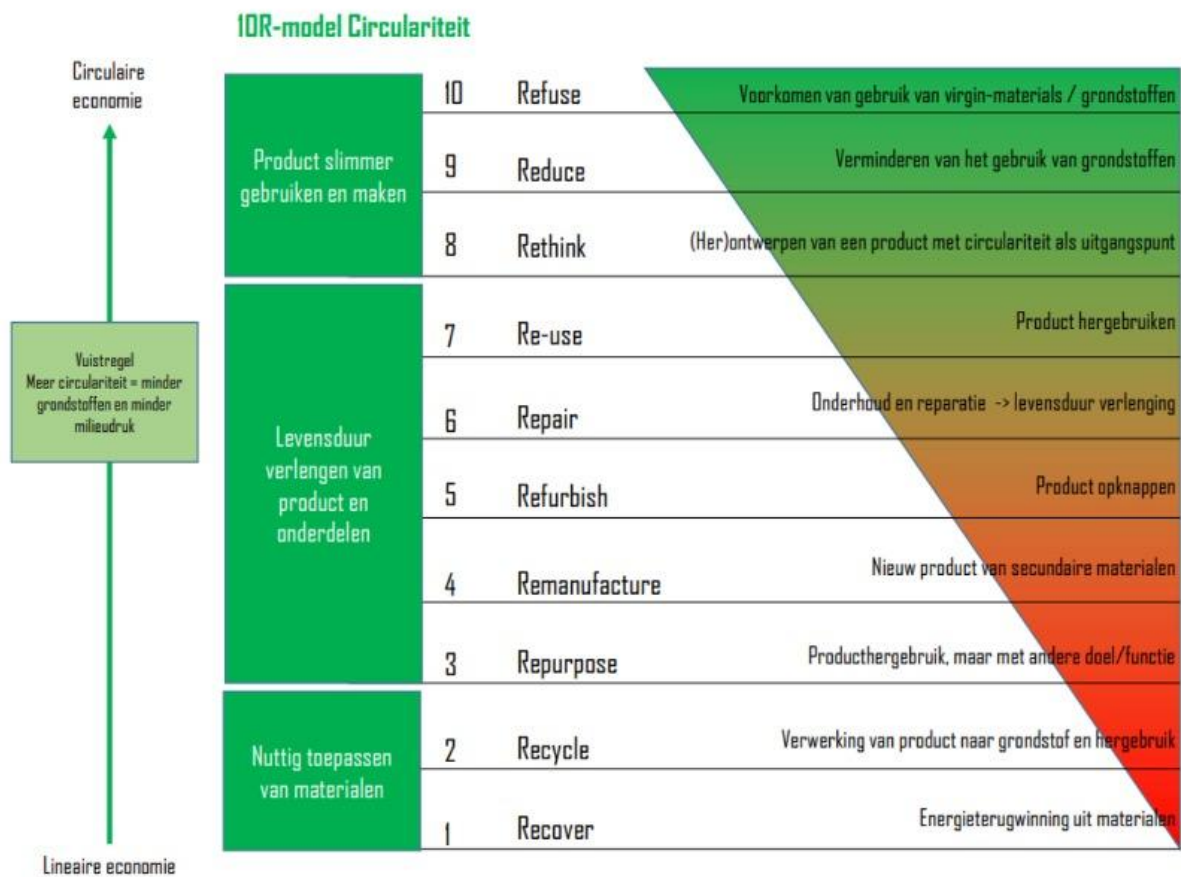

1.5 Circulaire Deal Secundaire bouwmaterialen Noord Holland Noord

Foekens, is een van de ondertekenaars van het circulaire deal secundaire bouwmaterialen Noord Holland Noord.

Wij staan niet alleen achter circulair slopen maar ook achter de gemaakte afspraken in deze deal. We zullen ons actief inzetten om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen circulair slopen in Nederland de norm te laten worden.

Hieronder staan de belangrijkste afspraken, die in het circulair deal secundaire bouwmaterialen Noord Holland Noord zijn opgenomen.

Artikel 1:

Doel De Provincie Noord-Holland en Circulair West-Friesland willen in 2050 volledig over naar een circulaire economie en willen dat het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% is gedaald.

Deze Circulaire Deal heeft als doel om de circulaire bouw in Noord-Holland Noord te stimuleren, minder grondstoffen te gebruiken en daarmee bij te dragen aan deze circulaire doelstellingen.

Beoogde effecten: - Alle Deelnemende Partijen passen standaard circulair oogsten toe; - Deelnemende Partijen maken, waar mogelijk, inzichtelijk hoeveel vrijkomend materiaal circulair is verwerkt en op welke wijze.

Deelnemende Partijen delen actief kennis en werken samen in zowel het vormen van circulaire ketens, als het inzichtelijk maken en koppelen van bestaande ketens, (digitale) platformen, en circulaire grondstoffen hubs.

Artikel 2: Subdoelen en maatregelen

Dit artikel werkt de drie subdoelen uit: 1. Circulair oogsten, 2. Kennisdeling, 3. Ketensamenwerking.

Onder elk subdoel vallen enkele maatregelen die de te nemen acties omschrijven.

2.1 Circulair oogsten wordt de standaard

2.1.1 Oogstvoorschriften vaststellen

De partijen hebben in aanloop naar het tekenen van de Circulaire Deal gezamenlijk de circulaire oogstvoorschriften vastgesteld. Deze zijn onderdeel van de Circulaire Deal (zie bijlage C).

2.1.2 Werken conform oogstvoorschriften

a) Deelnemende Partijen

i. Iedere Deelnemende Partij zal binnen 2 jaar volledig werken conform de minimale eisen en algemene voorwaarden uit de circulaire oogstvoorschriften (zie bijlage C). Iedere Deelnemende Partij zal de circulaire oogstvoorschriften in 2024 ten minste op 50% van alle sloopp projecten toepassen die hij of zij uitvoert of laat uitvoeren in de regio Noord-Holland Noord.

b) Initiatiefnemers

i. De initiatiefnemers organiseren een bijeenkomst, indien hier vraag naar is, over het voldoen aan de oogstvoorschriften. Wanneer deelnemende partijen merken dat hun partners niet voldoen aan de oogstvoorschriften, kunnen deze hiernaar verwezen worden. De initiatiefnemers zullen dan met deze betreffende partijen een bijeenkomst inplannen waarin de voorschriften worden toegelicht. Ook wordt er dan uitleg geboden over hoe deze partijen hieraan kunnen voldoen.

2.1.3 Voorschriften onder de aandacht brengen

Iedere Deelnemende Partij zal gedurende de looptijd van deze Circulaire Deal bij ten minste 3 andere partijen (niet zijnde Deelnemende Partijen) de voorschriften onder de aandacht brengen en verzoeken deze toe te passen als standaard voor circulair oogsten in zijn of haar sloopp project.

2.2 Kennisdeling

2.2.1 Informatie aanleveren

Alle Deelnemende Partijen leveren kennis en ervaringen aan bij Initiatiefnemers over projecten waar de circulaire oogstvoorschriften zijn toegepast ter evaluatie, kennisdeling en doorontwikkeling.

2.2.2 Structureel kennis uitwisselen.

In essentie delen alle partijen kennis met elkaar en wisselen zij ervaringen uit. Dit gebeurt onder andere op de volgende manieren:

a) Deelnemende Partijen


- i. De kennis en ervaring, knelpunten en leerlessen van circulaire sloopprojecten en circulair bouwen in het algemeen, delen via de eigen communicatiekanalen.
- ii. Kennis en ervaring, knelpunten en leerlessen delen met elkaar tijdens de sessies te organiseren door de Initiatiefnemers. Zie sub a).
- iii. Halfjaarlijks een overzicht verstrekken van de verwachte bouwprojecten in Noord-Holland Noord (waaronder sloop, nieuwbouw, herstructurering en renovatie). De kennis over deze geplande bouwprojecten kan door de Deelnemende Partijen worden gebruikt ter verkenning van mogelijkheden voor circulair bouwen.

b) Initiatiefnemers

- i. De Initiatiefnemers zullen nog ten minste twee sessies organiseren waarin er de mogelijkheid is tot het delen van opgedane kennis.
- ii. De Initiatiefnemers organiseren, indien nodig, ketensessies om kansen en belemmeringen in kaart te brengen, te bespreken en te onderzoeken op welke wijze de doelen kunnen worden bevorderd met acties op deze onderwerpen.
- iii. De Initiatiefnemers richten eind dit jaar een monitor in met als doel om kennis vast te leggen, voortgang te monitoren en te evalueren. Tenzij de Initiatiefnemers anders besluiten.

c) Uitzondering: Informatie-uitwisseling is niet van toepassing op bedrijfsvertrouwelijke of (concurrentie)gevoelige informatie, door Partij zelf te beoordelen.

2 Behandeling en afvoer sloopmaterialen

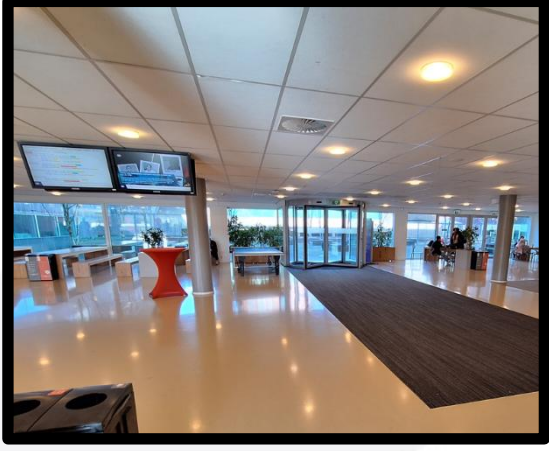Systeemplafonds	
Omschrijving	
Mineraalvezel systeemplafond inclusief aluminium raster en houten kantlatten	
Hoeveelheid	
1.046m ² / 6,11 ton	
➤ Demontage en bevestiging De plafondplaten zitten in de raster deze dienen voorzichtig los gehaald te worden en te worden verzameld conform de eisen van Circq.	
➤ Bruikbaarheid <u>7 Re-Use</u> De werkwijze voor het gebruik van CircQ plafondplaten is gericht op circulariteit en hergebruik. Oude plafondpanelen worden geoogst, beoordeeld op technische staat en, indien mogelijk, opnieuw voorzien van een nieuwe look. Dit kan door ze te reinigen en opnieuw te schilderen met een milieuvriendelijke verf, of door een nieuw akoestisch vlies aan te brengen. <u>4 Remanufacture</u> De platen die kapot zijn, zijn ingezameld om als mono product te fungeren voor de isolatie branche.	
➤ Afkeur criteria Vervuiling van andere materialen, kapotte platen	
➤ Controle op afkeur criteria Uitvoerder	
➤ Controle referentie Circq	
➤ Afzetmogelijkheden Upcycling	
➤ Uiteindelijke afzet Circq certificaat en Stortbonnen Er is 200m² plafondplaten geoogst, de overige plafondplaten waren dusdanig kapot dat ze niet bruikbaar waren voor Circq. De restant van de plafondplaten zijn afgevoerd naar Renewi.	
➤ 10R Model 7 Re-use 4 Remanufacture	

CERTIFICAAT

> **Bedankt** voor jouw bijdrage

Dank voor jouw bijdrage aan de circulaire bouw. Circq heeft in ontvangst genomen:

Naam:	Foekens
Locatie:	Amsterdam, Laan van Spartaan 2
Aantal m2:	200 M2 plafondpanelen
Besparing op CO2:	480 kg

Wij gaan deze plafondpanelen een tweede leven geven! We brengen een nieuw akoestisch vlies aan zodat ze er weer als nieuw uitzien. We besparen daarmee grondstoffen en de uitstoot van CO2 is zelfs 70% minder in vergelijking met nieuwe plafondpanelen!

Jouw bijdrage helpt. Een besparing van 480 Kg aan CO2 uitstoot staat gelijk aan 2.160 km autorijden. Goed bezig!



Circq B.V. | Van Slingelandtlaan 8 | 210 BR Heemstede | email/facturatie: info@circq.nl

Jouw steenwol duurzaam laten recycleren

Circulaire oplossing voor steenwol



From used rock wool to renewed rock wool



Hoe wordt steenwol gemaakt?

ROCKWOOL vervaardigt steenwol uit de grondstof basalt, door basalt en gerecyclede steenwol te versmelten met andere grondstoffen bij 1500°C. De vloeibare steensmelt wordt vervolgens tot vezels gesponnen en tot eindproducten verwerkt. Uit slechts 1 m³ basalt kan tot ongeveer 100 m³ steenwol worden gewonnen.

ROCKWOOL steenwol-producten zijn volledig recyclebaar. Bij het maken van nieuwe producten kan tot wel 50% gerecycled materiaal worden ingezet om nieuwe producten van oorspronkelijke kwaliteit te produceren. Bovendien hebben deze steenwolproducten een zeer lange levensduur: tot wel 75 jaar.

Randafwerking systeemplafonds

Omschrijving


Wit geschilderd spaanplaat op houten regelwerk tpv trappenhuis

Hoeveelheid

Spaanplaat 7,84 m² / 0,094 ton

➤ Demontage en bevestiging

De spaanplaat is geschroefd en zal met een schroeftol worden losgemaakt.

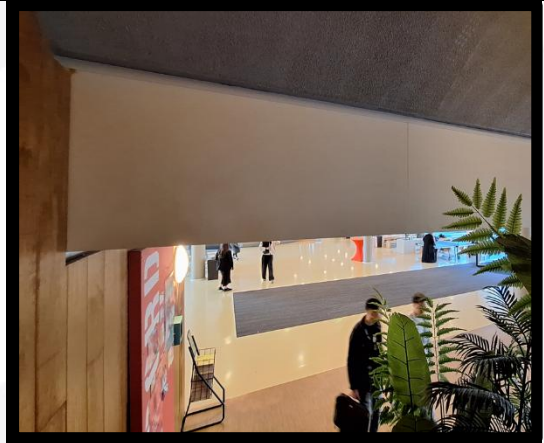

➤ Bruikbaarheid

4 Remanufacture

Het hout zal het hout gescheiden worden afgevoerd als A- en B hout in de daarvoor bestemde containers. Het klasse A-hout (schoon) en B-Hout (behandeld) zal worden geshredderd. Het geshredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.

➤ Afkeur criteria

Vervuiling van andere materialen

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen

➤ Afzetmogelijkheden

Hoogwaardig recyclen

➤ Uiteindelijke afzet

Het hout is meegenomen naar de verzamelcontainer van Foekens omdat er een gering houtafval was.

➤ 10R Model

4 Remanufacture



Printdatum	: 21-07-2025	Acceptant	: JennyW
Bonnummer	: W899592	Ordernummer	: B987029
Datum/tijd	: 18-07-2025 00:00	Standplaats	: 3725
Kenteken	: 02-BJJ-9		Zaandam - Sluispolderweg 27
Vestiging	: 2	Rekeningnemer	: Klant
Administratie	: 1		
Vervoerder	: 1		
Klant	: 16150		
Herkomst	:		
Weegartikel	: 1310	Bewerking	: Ingaande vracht
Locatie	:	Vol gewicht	: 30.260 kg (H)
AMvB-stroom	: 073CA1615003	Cont. gewicht	: 0 kg (H)
Vergunning	: 073CA	Leeg gewicht	: 17.100 kg (H)
Begeleidingsnr.	:	Netto gewicht	: 13.160 kg (H)
Container	:	Volume	: 0,000 m3

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01



Printdatum	: 31-07-2025		Acceptant	: PBA_SYSTEM
Bonnummer	: W901876		Ordernummer	: B990325
Datum/tijd	: 31-07-2025	09:26 / 09:52	Standplaats	: 3725
Kenteken	: 71-BTZ-2			: Zaandam - Sluispolderweg 27
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.	Rekeningnemer	: Klant
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV		
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.		
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.		
Herkomst	:			
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)	Bewerking	: Ingaande vracht
Locatie	:		Vol gewicht	: 24.640 kg
AMvB-stroom	: 073CA1615003		Cont. gewicht	: 0 kg
Vergunning	: 073CA		Leeg gewicht	: 17.420 kg
Begeleidingsnr.	: DIGITAAL		Netto gewicht	: 7.220 kg
Container	:			

Order: B990325

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01

Luchtroosters plafond

Omschrijving


Ventilatioeroosters in het systeemplafond
excl. luchtbehandelingskanaal

Hoeveelheid

18 st / 0,27 ton

➤ Demontage en bevestiging

De roosters zitten in de raster deze dienen voorzichtig los gehaald te worden en te worden verzameld conform de eisen van Ooijevaar.

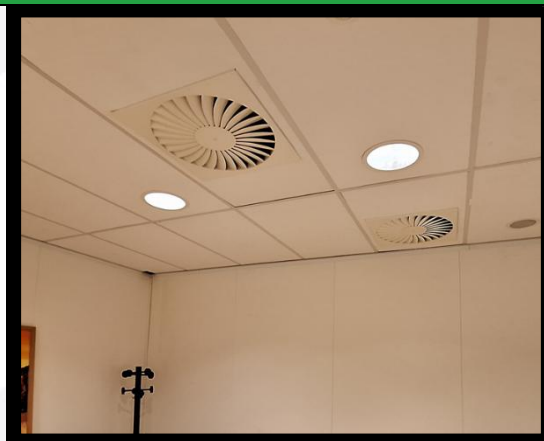

➤ Bruikbaarheid

7 Re-Use

De roosters zullen geoogst worden en hergebruikt worden in de mbo zelf om zo optimaal de circulaire gedachtegang toe te passen.

➤ Afkeur criteria

Kapotte roosters

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Reispasspoortje

➤ Afzetmogelijkheden

Hergebruik

➤ Uiteindelijke afzet

De luchtroosters van het plafond zijn zwartgemaakt en hergebruikt door Ooijevaar in het project.

➤ 10R Model

7 Re-Use

REISPASPOORT



Naam
Leeftijd
Kenmerken

Luchtroosters
5 - 10 jaar +/-
Witte luchtroosters

Herkomst
Opdrachtgever
Project
Adres
Plaats

ROC AMSTERDAM te Adam
ROC Amsterdam
Laan van Spartaan 2
Amsterdam

Aankomst
Opdrachtgever
Project
Adres en plaats
bestemming

21-07-2025
Ooijevaar
Renovatie MBO
laan van Spartaan 2
Amsterdam

Plafondverlichting

Omschrijving


Plafondverlichting (plafondspots en hanglampen)

Hoeveelheid

98 st / 0,049 ton

➤ Demontage en bevestiging

De lampen zitten in de raster deze dienen voorzichtig los gehaald te worden en te worden verzameld conform de eisen van Ooijevaar.

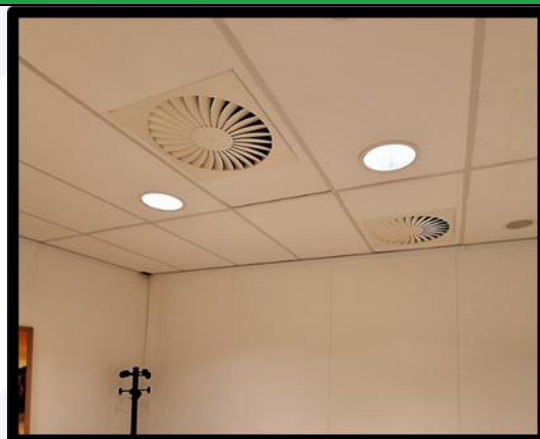

➤ Bruikbaarheid

7 Re-Use

De lampen zullen geoogst worden en hergebruikt worden in de mbo zelf om zo optimaal de circulaire gedachtegang toe te passen.

➤ Afkeur criteria

Kapotte roosters

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Reispaspoortje

➤ Afzetmogelijkheden

Hergebruik

➤ Uiteindelijke afzet

De plafondverlichting is hergebruikt door Ooijevaar in het project.

➤ 10R Model

7 Re-Use

REISPASPOORT



Naam
Leeftijd
Kenmerken

Lampen
5 - 10 jaar +/-
Lampen

Herkomst
Opdrachtgever
Project
Adres
Plaats

ROC AMSTERDAM te Adam
ROC Amsterdam
Laan van Spartaan 2
Amsterdam

Aankomst
Opdrachtgever
Project
Adres en plaats
bestemming

21-07-2025
Ooijevaar
Renovatie MBO
laan van Spartaan 2
Amsterdam

Verhoogde vloer

Omschrijving

Houten verhoogde vloer met laminaat en houten schrootjes aan de zijkanten

Hoeveelheid

65,86 m² / 1,77 ton

➤ Demontage en bevestiging

De verhoogde vloer zit geschroefd en gekit en zal met hand en elektrische gereedschap los worden gemaakt.



➤ Bruikbaarheid

4 Remanufacture

Het hout zal het hout gescheiden worden afgevoerd als A- en B hout in de daarvoor bestemde containers. Het klasse A-hout (schoon) en B-Hout (behandeld) zal worden geshredderd. Het geshredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.

➤ Afkeur criteria

Vervuiling van andere materialen

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen

➤ Afzetmogelijkheden

Hoogwaardig recycleren

➤ Uiteindelijke afzet

Het hout is meegenomen naar de verzamelcontainer van Foekens omdat er een gering houtafval was.

➤ 10R Model

4 Remanufacture



Printdatum	: 21-07-2025		
Bonnummer	: W899592		
Datum/tijd	: 18-07-2025	00:00	
Kenteken	: 02-BJJ-9		
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.	
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV	
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.	
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.	
Herkomst	:		
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)	
Locatie	:		
AMvB-stroom	: 073CA1615003		
Vergunning	: 073CA		
Begeleidingsnr.	:		
Container	:		
Acceptant	: JennyW		
Ordernummer	: B987029		
Standplaats	: 3725		
		Zaandam - Sluispolderweg 27	
Rekeningnemer	: Klant		
Bewerking	: Ingaande vracht		
Vol gewicht	: 30.260 kg (H)		
Cont. gewicht	: 0 kg (H)		
Leeg gewicht	: 17.100 kg (H)		
Netto gewicht	: 13.160 kg (H)		
Volume	: 0,000 m3		

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01



Printdatum	: 31-07-2025		Acceptant	: PBA_SYSTEM
Bonnummer	: W901876		Ordernummer	: B990325
Datum/tijd	: 31-07-2025	09:26 / 09:52	Standplaats	: 3725
Kenteken	: 71-BTZ-2			: Zaandam - Sluispolderweg 27
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.	Rekeningnemer	: Klant
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV		
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.		
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.		
Herkomst	:			
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)	Bewerking	: Ingaande vracht
Locatie	:		Vol gewicht	: 24.640 kg
AMvB-stroom	: 073CA1615003		Cont. gewicht	: 0 kg
Vergunning	: 073CA		Leeg gewicht	: 17.420 kg
Begeleidingsnr.	: DIGITAAL		Netto gewicht	: 7.220 kg
Container	:			

Order: B990325

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01

Bestaande balie

Omschrijving

Balie bestaande uit een houten constructie bekleed met zachte isolatie en doek

Hoeveelheid

10 m¹ / 0,2 ton

➤ Demontage en bevestiging

De balie zit geschroefd en gekit en zal met hand en elektrische gereedschap los worden gemaakt.



➤ Bruikbaarheid

4 Remanufacture

Het hout zal het hout gescheiden worden afgevoerd als A- en B hout in de daarvoor bestemde containers. Het klasse A-hout (schoon) en B-Hout (behandeld) zal worden geshredderd. Het geshredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.

1 Recover

Het gedeelte wat niet losgekoppeld kan worden van het hout en de zachte isolatie en doek zal als bouw en sloop afgevoerd worden.

➤ Afkeur criteria

Vervuiling van andere materialen

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen

➤ Afzetmogelijkheden

Hoogwaardig recyclen, verbranding

➤ Uiteindelijke afzet

Het hout is meegenomen naar de verzamelcontainer van Foekens omdat er een gering houtafval was.

➤ 10R Model

4 Remanufacture en 1 Recover



Printdatum	: 21-07-2025		
Bonnummer	: W899592		
Datum/tijd	: 18-07-2025	00:00	
Kenteken	: 02-BJJ-9		
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.	
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV	
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.	
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.	
Herkomst	:		
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)	
Locatie	:		
AMvB-stroom	: 073CA1615003		
Vergunning	: 073CA		
Begeleidingsnr.	:		
Container	:		
Acceptant	: JennyW		
Ordernummer	: B987029		
Standplaats	: 3725		
		Zaandam - Sluispolderweg 27	
Rekeningnemer	: Klant		
Bewerking	: Ingaande vracht		
Vol gewicht	: 30.260 kg (H)		
Cont. gewicht	: 0 kg (H)		
Leeg gewicht	: 17.100 kg (H)		
Netto gewicht	: 13.160 kg (H)		
Volume	: 0,000 m3		

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01



Printdatum	: 31-07-2025		Acceptant	: PBA_SYSTEM
Bonnummer	: W901876		Ordernummer	: B990325
Datum/tijd	: 31-07-2025	09:26 / 09:52	Standplaats	: 3725
Kenteken	: 71-BTZ-2			: Zaandam - Sluispolderweg 27
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.	Rekeningnemer	: Klant
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV		
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.		
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.		
Herkomst	:			
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)	Bewerking	: Ingaande vracht
Locatie	:		Vol gewicht	: 24.640 kg
AMvB-stroom	: 073CA1615003		Cont. gewicht	: 0 kg
Vergunning	: 073CA		Leeg gewicht	: 17.420 kg
Begeleidingsnr.	: DIGITAAL		Netto gewicht	: 7.220 kg
Container	:			

Order: B990325

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

version 7.0 28/01/19
Raboteuren: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

logistiek
concurrent.nl
Raboteuren

1 BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam**
VIHB-nummer **Tel. 075 - 20 26 768**

2 **factuuradres**

postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a ontvoerder **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam**
Tel. 075 - 20 26 768

4^a uitbesteed vervoerder **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **Zaandam**
VIHB-nummer

3^b locatie van herkomst **Gerrit Fockes**
straat + nr **Gerrit Fockes**
postc. + woonpl. **Nieuwmarkt / aan**
datum aanvang transport **17-7-25**

4^b locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **REAX BOUWBAK** VIHB-nummer **533307 VIHB**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam** kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6 **afvalstroomnummer** **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen** **9** **aantal/** **eural** **verw.** **geschatte**
verpakking **code** **meth.** **hoeveelheid**
(kg)
1380 kg

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene
voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 14691416

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelij- kenummerde vrachtbrief
			

Rachelwerk en beplating verwijderen

Omschrijving

Diverse wandbeplating van spaanplaat, houten schroten op houten regelwerk

Hoeveelheid

144 m² / 2,77 ton

➤ Demontage en bevestiging

Het rachelwerk zit geschroefd en gekit en zal met hand en elektrische gereedschap los worden gemaakt.



➤ Bruikbaarheid

4 Remanufacture

Het hout zal het hout gescheiden worden afgevoerd als A- en B hout in de daarvoor bestemde containers. Het klasse A-hout (schoon) en B-Hout (behandeld) zal worden geshredderd. Het geshredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.

➤ Afkeur criteria

Vervuiling van andere materialen

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen

➤ Afzetmogelijkheden

Upcycling

➤ Uiteindelijke afzet

Het rachelwerk is gebruikt om een kantoor ruimte te creëren.

➤ 10R Model

7 Re-Use

REISPASPOORT



Naam
Leeftijd
Kenmerken

Houten beplating
5 - 10 jaar +/-
Stroken Hout

Herkomst
Opdrachtgever
Project
Adres
Plaats

ROC AMSTERDAM te Adam
ROC Amsterdam
Laan van Spartaan 2
Amsterdam

Aankomst
Opdrachtgever
Project
Adres en plaats
bestemming

21-07-2025
Particulier
Kantoorruimte maken
AVG

Brandblussers / brandslangen

Omschrijving

Brandslanghaspelkasten inclusief brandslanghaspels, worden hergebruikt op locatie

Hoeveelheid

2 st / 0,08

➤ Demontage en bevestiging

Geschroefd, ze dienen los geschroefd te worden.



➤ Bruikbaarheid

7 Re-Use

De haspels en brandblussers zullen geoogst worden en hergebruikt worden in de mbo zelf om zo optimaal de circulaire gedachtegang toe te passen.

➤ Afkeur criteria

Kapotte roosters

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Reispaspoortje

➤ Afzetmogelijkheden

Hergebruik

➤ Uiteindelijke afzet

De brandblussers zijn hergebruikt door Ooijevaar in het project

➤ 10R Model

7 Re-Use

REISPASPOORT



Naam
Leeftijd
Kenmerken

Brandhaspels
5 - 10 jaar +/-
Brandhaspels

Herkomst
Opdrachtgever
Project
Adres
Plaats

ROC AMSTERDAM te Adam
ROC Amsterdam
Laan van Spartaan 2
Amsterdam

Aankomst
Opdrachtgever
Project
Adres en plaats
bestemming

21-07-2025
Ooijevaar
Renovatie MBO
laan van Spartaan 2
Amsterdam

Schoonloopmat

Omschrijving


Schoonloopmat in stalen randprofiel

Hoeveelheid

54,80 m² / 0,4384 ton

➤ Demontage en bevestiging

Gelijmd, het dient met een tapijtstripper worden verwijderd.

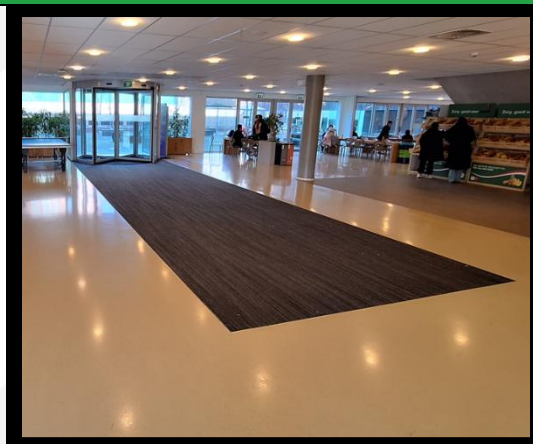

➤ Bruikbaarheid

1 Recover

Tapijt is een gedeelte van de bouw en sloopafval wat niet verder gesorteerd en gerecycled kan worden. De afvalverwerker voert deze afvalstroom af naar een Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

➤ Afkeur criteria

Nvt

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen

➤ Afzetmogelijkheden

Verbranding

➤ Uiteindelijke afzet

De schoonloopmat is afgevoerd als bouw en sloop afval

➤ 10R Model

1 Recover

1 BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

version 7.0 28/01/19
Raboteuren: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

logistiek
concurrent.nl

1 ☒ ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam**
VIHB-nummer **Tel. 075 - 20 26 768**

2
factuuradres

postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontdoener **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam**
Tel. 075 - 20 26 768

4
uitbesteed vervoerder **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **Zaandam**
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst **Gerrit Fockes**
straat + nr **Gerrit Fockes**
postc. + woonpl. **Nieuwmarkt / aan**
datum aanvang transport **17-7-25**

4
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam**
VIHB-nummer **533307 VIHB**
kenteken
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
aantal/
verpakking
eural
code
verw.
meth.
geschatte
hoeveelheid
(kg)
9
1380 kg

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene
voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 14691416

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelij- kenummerde vrachtbrief

Vinylvloer

Omschrijving


Vinylvloerafwerking in stalen randprofiel

Hoeveelheid

54,24 m² / 0,16 ton

➤ Demontage en bevestiging

Gelijmd, het dient met een tapijtstripper worden verwijderd.

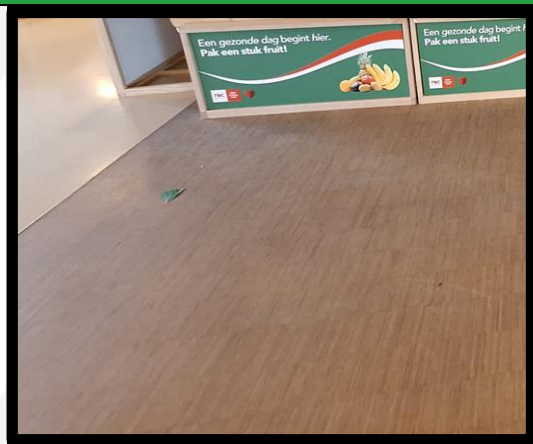

➤ Bruikbaarheid

1 Recover

Vinylzeil is een gedeelte van de bouw en sloopafval wat niet verder gesorteerd en gerecycled kan worden. De afvalverwerker voert deze afvalstroom af naar een Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

➤ Afkeur criteria

Nvt

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen

➤ Afzetmogelijkheden

Verbranding

➤ Uiteindelijke afzet

De vinylvloer is afgevoerd als bouw en sloop afval.

➤ 10R Model

1 Recover

1 BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

version 7.0 28/01/19
Nabezetter: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

logistiek
concurrent.nl

1 ☒ ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam**
VIHB-nummer **Tel. 075 - 20 26 768**

2 **factuuradres**

postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3 **ontdoener**
straat + nr **REAX BOUWBAK**
postc. + woonpl. **Gerritbolkade 13**
VIHB-nummer **1507 BR Zaandam**
Tel. 075 - 20 26 768

4 **uitbesteed vervoerder**
straat + nr **REAX BOUWBAK**
postc. + woonpl. **Gerritbolkade 13**
VIHB-nummer **2AANDAM**

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam**
VIHB-nummer **533307 VIHB**

6 **route-inzameling** ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen** **9** **santal/verpakking** **eural code** **verw. meth.** **geschatte hoeveelheid (kg)**
1380 kg

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 14691416

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geaccrediteerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief
			

Systeemwanden

Omschrijving

Systeemwanden (Elementpanelen) en houten voorzetwanden


Hoeveelheid

125 m² / 3,06 ton

➤ Demontage en bevestiging

De systeemwanden zitten geschroefd en dienen losgekoppeld te worden.

De voorzetwanden zitten geschroefd en dienen losgeschroefd te worden.

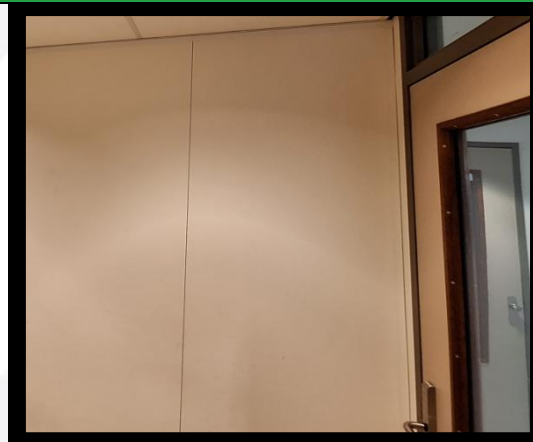

➤ Bruikbaarheid

2 Recycle

1 Recover

Bouw en sloop afval

Daar worden met machines en handmatige selectie de verschillende materialen gescheiden. Puin (beton, baksteen, tegels, keramiek): wordt gebroken tot granulaat → gebruikt als funderingsmateriaal of als grondstof voor nieuw beton.

Hout: gesorteerd in A/B/C-hout → hergebruik als plaatmateriaal, of als brandstof in bio-energiecentrales. Metalen (ijzer, koper, aluminium): volledig gerecycled tot nieuwe metalen.

Gipsplaten: gescheiden en verwerkt tot nieuw gips. Restafval: wat niet recyclebaar is, gaat naar verbranding met energierugwinning en hergebruik

7 Re-use

De houten afzetplaten zijn opgeslagen in de houtcontainer bij Foekens sloopcombinatie bv. Geperste houtenplaten.

➤ Afkeur criteria

Nvt, kapotte plaatmateriaal

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen, Reispaspoort

➤ Afzetmogelijkheden

Upcycling, Recycling en Recover

➤ Uiteindelijke afzet

De systeemwanden zijn afgevoerd als bouw en sloop afval

De houten voorzetwanden zijn hergebruikt door Ooijevaar

➤ 10R Model

7 Re-use

2 Recycle

1 Recover

1 BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

version 7.0 28/01/19
Nabezetter: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

logistiek
concurrent.nl

1 ☒ ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam**
VIHB-nummer **Tel. 075 - 20 26 768**

2 **factuuradres**

postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3 **ontdoener**
straat + nr **REAX BOUWBAK**
postc. + woonpl. **Gerritbolkade 13**
1507 BR Zaandam
Tel. 075 - 20 26 768

4 **uitbesteed vervoerder**
straat + nr **REAX BOUWBAK**
postc. + woonpl. **Gerritbolkade 13**
1507 BR Zaandam
VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **REAX BOUWBAK**
straat + nr **Gerritbolkade 13**
postc. + woonpl. **1507 BR Zaandam**
VIHB-nummer **533307 VIHB**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6 **afvalstroomnummer** **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen** **9** **santal/verpakking** **eural code** **verw. meth.** **geschatte hoeveelheid (kg)**
1380 kg

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 14691416

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geaccrediteerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief
			



Printdatum	: 31-07-2025		Acceptant	: PBA_SYSTEM
Bonnummer	: W901876		Ordernummer	: B990325
Datum/tijd	: 31-07-2025	09:26 / 09:52	Standplaats	: 3725
Kenteken	: 71-BTZ-2			: Zaandam - Sluispolderweg 27
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.	Rekeningnemer	: Klant
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV		
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.		
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.		
Herkomst	:			
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)	Bewerking	: Ingaande vracht
Locatie	:		Vol gewicht	: 24.640 kg
AMvB-stroom	: 073CA1615003		Cont. gewicht	: 0 kg
Vergunning	: 073CA		Leeg gewicht	: 17.420 kg
Begeleidingsnr.	: DIGITAAL		Netto gewicht	: 7.220 kg
Container	:			

Order: B990325

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01

Puilen en kozijnen

Omschrijving


Houten en glazen puilen en deuren

Hoeveelheid

62,6 m² / 2,30 ton

➤ Demontage en bevestiging

Geklemd en geschroefd. De kozijnen zullen met elektrisch en handgereedschap worden weggehaald.

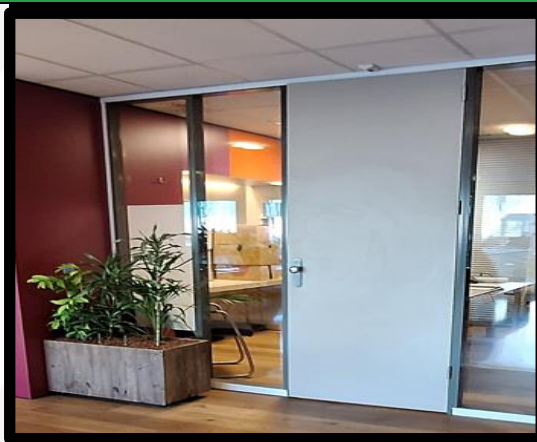

➤ **Bruikbaarheid**

4 Remanufacture

Het hout van de kozijnen zullen gescheiden worden afgevoerd als A- en B hout in de daarvoor bestemde containers. Het klasse A-hout (schoon) en B-Hout (behandeld) zal worden geshredderd. Het geshredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets. Het glas dat vrijkomt zal worden afgevoerd naar vlakglas. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar. Het glas zal worden omgesmolten tot nieuw glas en volledig worden hergebruikt in een ander product. Er is een optimale kringloop, zonder restafval of kwaliteitsverlies.

➤ **Afkeur criteria**

Vervuiling van andere materialen

➤ **Controle op afkeur criteria**

Uitvoerder

➤ **Controle referentie**

Stortbonnen

➤ **Afzetmogelijkheden**

Hoogwaardig recyclen

➤ **Uiteindelijke afzet**

De houten delen van de puilen zijn gescheiden afgevoerd als hout en in de verzamelcontainer op de sluispolderweg 27 te Zaandam

De glazen delen van de puilen zijn gescheiden afgevoerd.

De Non Ferro stroom is afgevoerd naar de Roeck

➤ **10R Model**

4 Remanufacture

DE ROECK RECYCLING BV		SPRINGERS DE ROECK RECYCLING BV	
Krabbaken 14 1505 HS Zaandam Telefoon • 075 - 635 74 54 • 020 - 665 01 89 E-mail • info@deroeck.nl Internet • www.deroeck.nl • www.springers.nl		Springers Recycling Bon nr. : 188524 ontvangen van / geleverd aan: W1 3990 kg 16-07-2025 16:01 W2 3510 kg 16-07-2025 16:07 ----- 480 kg In	
vrachtbrief no. : expediteur : kenteken : VBB64 container no. :		vrachtbrief no. : expediteur : kenteken : VBB64 container no. :	
Soort ID. : ID nr. : opmerking :		Soort ID. : ID nr. : opmerking :	
radioactiviteit: goed / fout BTW verlegd Uw BTW nummer:		radioactiviteit: goed / fout BTW verlegd Uw BTW nummer:	
acc.weger/kas.		acc.weger/kas.	

materiaal soort	netto	prijs	totaal
gzer	450 kg		

materiaal soort	netto	prijs	totaal
gzer	480 kg		



Printdatum	: 21-07-2025			Acceptant	: JennyW
Bonnummer	: W899592			Ordernummer	: B987029
Datum/tijd	: 18-07-2025	00:00		Standplaats	: 3725
Kenteken	: 02-BJJ-9				: Zaandam - Sluispolderweg 27
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.		Rekeningnemer	: Klant
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV			
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.			
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.			
Herkomst	:				
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)		Bewerking	: Ingaande vracht
Locatie	:			Vol gewicht	: 30.260 kg (H)
				Cont. gewicht	: 0 kg (H)
AMvB-stroom	: 073CA1615003			Leeg gewicht	: 17.100 kg (H)
Vergunning	: 073CA			Netto gewicht	: 13.160 kg (H)
Begeleidingsnr.	:			Volume	: 0,000 m3
Container	:				

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01



Printdatum	: 31-07-2025		Acceptant	: PBA_SYSTEM
Bonnummer	: W901876		Ordernummer	: B990325
Datum/tijd	: 31-07-2025	09:26 / 09:52	Standplaats	: 3725
Kenteken	: 71-BTZ-2			: Zaandam - Sluispolderweg 27
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.	Rekeningnemer	: Klant
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV		
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.		
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.		
Herkomst	:			
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)	Bewerking	: Ingaande vracht
Locatie	:		Vol gewicht	: 24.640 kg
AMvB-stroom	: 073CA1615003		Cont. gewicht	: 0 kg
Vergunning	: 073CA		Leeg gewicht	: 17.420 kg
Begeleidingsnr.	: DIGITAAL		Netto gewicht	: 7.220 kg
Container	:			

Order: B990325

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01

Diverse bevestigingsmiddelen

Omschrijving

Plafondhangers en bevestigingspunten, en vervallen leidingwerk onder verhoogde vloer

Hoeveelheid

300 m² / 0,16 ton

➤ Demontage en bevestiging

Gestort, geklemd. Met reciprozaag en slijptol verwijderen.



➤ Bruikbaarheid

4 Remanufacture

De materialen zullen als (non) ferro gescheiden worden afgevoerd.

Vanuit de metaalhandel gaat het (non)ferro naar de smelterijen om omgesmolten te worden, zodat hier weer nieuwe producten van gemaakt kan worden.

➤ Afkeur criteria

Vervuiling van andere materialen

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen

➤ Afzetmogelijkheden

Hoogwaardig recyclen

➤ Uiteindelijke afzet

De Non Ferro stroom is afgevoerd naar de Roeck

➤ 10R Model

4 Remanufacture



DE ROECK
RECYCLING BV

Kruitbaken 14
1505 HS Zaandam
Telefoon • 075 - 635 74 54
• 020 - 665 01 89
E-mail • info@deroock.nl
Internet • www.deroock.nl
• www.springers.nl



SPRINGERS DE ROECK
RECYCLING BV

Bon nr. : 189141

ontvangen van / geleverd aan:

W1 3620 kg 01-08-2025 16:04

W2 3170 kg 01-08-2025 16:12

450 kg In

vrachtbrief no.:

expediteur :

kenteken : VBB64 FFFF

container no. :

Soort ID. :

ID nr. :

opmerking :

radioactiviteit: goed / fout
BTW verlegd

Uw BTW nummer:

materiaal soort	netto	prijs	totaal
gzer	450 kg		

acc.weger/kas.



DE ROECK
RECYCLING BV

Kruitbaken 14
1505 HS Zaandam
Telefoon • 075 - 635 74 54
• 020 - 665 01 89
E-mail • info@deroock.nl
Internet • www.deroock.nl
• www.springers.nl



SPRINGERS DE ROECK
RECYCLING BV

Bon nr. : 188524

ontvangen van / geleverd aan:

W1 3990 kg 16-07-2025 16:01

W2 3510 kg 16-07-2025 16:07

480 kg In

vrachtbrief no.:

expediteur :

kenteken : VBB64 FFFF

container no. :

Soort ID. :

ID nr. :

opmerking :

radioactiviteit: goed / fout
BTW verlegd

Uw BTW nummer:

materiaal soort	netto	prijs	totaal
gzer	480 kg		

acc.weger/kas.

Radiatoren

Omschrijving

Stalen radiator

Hoeveelheid

1 st / 0,165 ton

➤ Demontage en bevestiging

Geschroefd, dient losgeschroefd te worden.



➤ **Bruikbaarheid**

4 Remanufacture

De radiator zal als (non) ferro gescheiden worden afgevoerd.

Vanuit de metaalhandel gaat het (non)ferro naar de smelterijen om omgesmolten te worden, zodat hier weer nieuwe producten van gemaakt kan worden.

➤ **Afkeur criteria**

Vervuiling van andere materialen

➤ **Controle op afkeur criteria**

Uitvoerder

➤ **Controle referentie**

Stortbonnen

➤ **Afzetmogelijkheden**

Hoogwaardig recyclen

➤ **Uiteindelijke afzet**

De Non Ferro stroom is afgevoerd naar de Roeck

➤ **10R Model**

4 Remanufacture



DE ROECK
RECYCLING BV

Kruitbaken 14
1505 HS Zaandam
Telefoon • 075 - 635 74 54
• 020 - 665 01 89
E-mail • info@deroeck.nl
Internet • www.deroeck.nl
• www.springers.nl



SPRINGERS DE ROECK
RECYCLING BV

Bon nr. : 189141

ontvangen van / geleverd aan:

W1 3620 kg 01-08-2025 16:04

W2 3170 kg 01-08-2025 16:12

450 kg In

vrachtbrief no.:

expediteur :

kenteken : VBB64 FFFF

container no. :

Soort ID. :

ID nr. :

opmerking :

radioactiviteit: goed / fout
BTW verlegd

Uw BTW nummer:

DE ROECK RECYCLING BV logo

DE ROECK
RECYCLING BV

Kruitbaken 14
1505 HS Zaandam
Telefoon • 075 - 635 74 54
• 020 - 665 01 89
E-mail • info@deroeck.nl
Internet • www.deroeck.nl
• www.springers.nl



SPRINGERS DE ROECK
RECYCLING BV

Bon nr. : 188524

ontvangen van / geleverd aan:

W1 3990 kg 16-07-2025 16:01

W2 3510 kg 16-07-2025 16:07

480 kg In

vrachtbrief no.:

expediteur :

kenteken : VBB64 FFFF

container no. :

Soort ID. :

ID nr. :

opmerking :

radioactiviteit: goed / fout
BTW verlegd

Uw BTW nummer:

materiaal soort	netto	prijs	totaal
gzer	480 kg		

acc.weger/kas.

materiaal soort	netto	prijs	totaal
gzer	450 kg		

acc.weger/kas.

Kastenwanden

Omschrijving

Kastenwand, bestaande uit een houtenconstructie met gefineerd plaatmateriaal

Hoeveelheid

37,93 m² / 1,13 ton

➤ Demontage en bevestiging

Geschroefd en geklemd het zal met hand en elektrisch gereedschap worden gedemonteerd.



➤ Bruikbaarheid

4 Remanufacture

Het hout zal het hout gescheiden worden afgevoerd als A- en B hout in de daarvoor bestemde containers. Het klasse A-hout (schoon) en B-Hout (behandeld) zal worden geshredderd. Het geshredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.

➤ Afkeur criteria

Vervuiling van andere materialen

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen

➤ Afzetmogelijkheden

Hoogwaardig recyclen

➤ Uiteindelijke afzet

Het hout is meegenomen naar de verzamelcontainer van Foekens omdat er een gering houtafval was.

➤ 10R Model

4 Remanufacture



Printdatum	: 21-07-2025			Acceptant	: JennyW
Bonnummer	: W899592			Ordernummer	: B987029
Datum/tijd	: 18-07-2025	00:00		Standplaats	: 3725
Kenteken	: 02-BJJ-9				: Zaandam - Sluispolderweg 27
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.		Rekeningnemer	: Klant
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV			
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.			
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.			
Herkomst	:				
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)		Bewerking	: Ingaande vracht
Locatie	:			Vol gewicht	: 30.260 kg (H)
				Cont. gewicht	: 0 kg (H)
AMvB-stroom	: 073CA1615003			Leeg gewicht	: 17.100 kg (H)
Vergunning	: 073CA			Netto gewicht	: 13.160 kg (H)
Begeleidingsnr.	:			Volume	: 0,000 m3
Container	:				

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01



Printdatum	: 31-07-2025		Acceptant	: PBA_SYSTEM
Bonnummer	: W901876		Ordernummer	: B990325
Datum/tijd	: 31-07-2025	09:26 / 09:52	Standplaats	: 3725
Kenteken	: 71-BTZ-2			: Zaandam - Sluispolderweg 27
Vestiging	: 2	Renewi Westpoort B.V.	Rekeningnemer	: Klant
Administratie	: 1	Renewi Westpoort Transport BV		
Vervoerder	: 1	Renewi Westpoort Transport B.V.		
Klant	: 16150	Foekens Sloopcombinatie B.V.		
Herkomst	:			
Weegartikel	: 1310	Hout ongesorteerd (A/B-Hout)	Bewerking	: Ingaande vracht
Locatie	:		Vol gewicht	: 24.640 kg
AMvB-stroom	: 073CA1615003		Cont. gewicht	: 0 kg
Vergunning	: 073CA		Leeg gewicht	: 17.420 kg
Begeleidingsnr.	: DIGITAAL		Netto gewicht	: 7.220 kg
Container	:			

Order: B990325

Renewi Westpoort B.V. • Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam • Postadres Velperweg 157, 6824 MB Arnhem
Tel 088 980 5000 • KvK nr 09143681 • BTW nr NL 8133.24.890.B01

Metalen omranding

Omschrijving

RVS hoekprofiel (opsluiting
schoonloopmat en vinyl)

Hoeveelheid

53,43 m1 / 0,026 ton

➤ Demontage en bevestiging

De metalen omranding zal ingeslepen worden.



➤ Bruikbaarheid

4 Remanufacture

De materialen zullen als (non) ferro gescheiden worden afgevoerd.

Vanuit de metaalhandel gaat het (non)ferro naar de smelterijen om omgesmolten te worden, zodat hier weer nieuwe producten van gemaakt kan worden.

➤ Afkeur criteria

Vervuiling van andere materialen

➤ Controle op afkeur criteria

Uitvoerder

➤ Controle referentie

Stortbonnen

➤ Afzetmogelijkheden

Hoogwaardig recyclen

➤ Uiteindelijke afzet

De Non Ferro stroom is afgevoerd naar de Roeck

➤ 10R Model

4 Remanufacture

DE ROECK RECYCLING BV		SPRINGERS DE ROECK RECYCLING BV	
Kruisbaken 14 1505 HS Zaandam Telefoon • 075 - 635 74 54 • 020 - 665 01 89 E-mail • info@deroeck.nl Internet • www.deroeck.nl • www.springers.nl		Bon nr. : 188524 ontvangen van / geleverd aan: W1 3990 kg 16-07-2025 16:01 W2 3510 kg 16-07-2025 16:07 ----- 480 kg In	
vrachtbrief no.:		vrachtbrief no.:	
expediteur :		expediteur :	
kenteken : VBB64		kenteken : VBB64	
container no. :		container no. :	
radioactiviteit: goed / fout BTW verlegd Uw BTW nummer:		radioactiviteit: goed / fout BTW verlegd Uw BTW nummer:	
Soort ID. :		Soort ID. :	
ID nr. :		ID nr. :	
opmerking :		opmerking :	
acc.weger/kas.		acc.weger/kas.	
materiaalsoort		materiaalsoort	
netto		netto	
prijs		prijs	
totaal		totaal	

3 CERTIFICAAT CIRCULAIRE SLOOPPROJECT

©

G Foekens

Afvalstroom	Ongstrapport	Type	Plaats in gebouw	Bevestigingsmethode	Hoeveelheid	eenheid	kg/eenheid	Totaal kg	Tonnage	Werkelijke tonnage	Productthergebruik	Hoeveelheid2	H recycling	Hoeveelheid3	Recycling	Hoeveelheid4	Verbranden	Hoeveelheid6	Bestemming	10 R Ladder	Uiteindelijke afzet
Systeemplafonds	1	BSA	Beg grond	Los in raster	1046	m2	5,85	6119,1	6,1191	6,1191	X	0,80000	X	5,31910					Cirq	7 Re-Use en 4 Manufacture	Cirq 200m2 overige naar Renewi, rasters naar Roeck
																			Renewi		CirQ zorgt voor een nieuwe vlies op de plafonds zodat deze hergebruikt kan worden
																			Roeck		De overige steenwol gaat naar Rockwool zodat er weer nieuwe steenwol van gemaakt kan worden
																					Metalen (ijzer, koper, aluminium): volledig gerecycled tot nieuwe metalen.
Randafwerkingen systeemplafonds	2	Hout	Beg grond	Geschroefd	7,84	m2	12	94,08	0,09408	0,09408			X	0,09408					Renewi	4 Manufacture	Verzamelcontainer Hout op werf
																					Het geshredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar
																					het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.
Luchtroosters plafond	3	BSA	Plafond	Los in raster	18	st	15	270	0,27	0,27	X	0,27							Ooijevaar	7 Re-Use	Door Ooijevaar zwart gespoten en terug geplaatst op locatie.
Plafondverlichting	4	BSA / Glas	Plafond	Geschroefd	98	st	0,5	49	0,049	0,049	X	0,049							Ooijevaar	7 Re-use	Door Ooijevaar terug geplaatst na reviseren op locatie.
Verhoogde vloer	5	Hout	Beg grond	Geschroefd en gekit	65,86	m2	27	1778,22	1,77822	1,77822			X	1,77822					Renewi	4 Remanufacture	Verzamelcontainer Hout op werf naar Renewi gegaan.
																					Het geredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar
																					het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.
Bestaande balie	6	Hout en BSA	Beg grond	Geschroefd en gekit	10	m	20	200	0,2	0,2			X	0,15			X	0,05	Renewi	4 Remanufacture , 1 Recovery	Verzamelcontainer Hout op werf en bas container
																			REAX		Het geredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar
																					het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.
																					De BSA zal verder worden uit gesorteerd bij de afvalverwerker en verwerkt in mono stromen en de BSA
																					wat niet gebruikt kan worden verband voor energiewinning.
Rachelwerk en beplating verwijderen	7	Hout	Beg grond	Geschroefd en gekit	144	m2	19,28	2776,32	2,77632	2,77632	X	2,77632							Particulier	7 Re-Use	Hergebruikt op een particuliere adres
Brandblussers / Brandslangen	8	BSA	Beg grond	Geschroefd	2	st	40	80	0,08	0,08	X	0,08							Ooijevaar	7 Re-Use	Door Ooijevaar terug geplaatst na reviseren
Schoonloopmat	9	BSA	Beg grond	Gelijmd	54,8	m2	8	438,4	0,4384	0,4384							X	0,4384	REAX	1 Recovery	bas container
																					De BSA zal verder worden uit gesorteerd bij de afvalverwerker en verwerkt in mono stromen en de BSA
																					wat niet gebruikt kan worden verband voor energiewinning.
Vinylvloer	10	BSA	Beg grond	Gelijmd	54,24	m2	3	162,72	0,16272	0,16272							X	0,16272	REAX	1 Recovery	bas container
																					De BSA zal verder worden uit gesorteerd bij de afvalverwerker en verwerkt in mono stromen en de BSA
																					wat niet gebruikt kan worden verband voor energiewinning.
Systeemwanden	11	BSA / Hout	Beg grond	Geschroefd	117,7	m2	26	3060,2	3,0602	3,0602	X	2,29515					X	0,76505	Foekens	7 Re-use, 1 Recovery	Geperste houtenplaten, gebruikt voor containment, afzetten kozijnen
																			Asbestverwijdering NM		in de houtcontainer op de werf Sluispolderweg 27 te Zaandam.
Puilen en kozijnen	12	Glas / Hout,	Pand	Geschroefd en geklemd	67,91	m2	34	2308,94	2,30894	2,30894			X	2,30894					Renewi	4 Remanufacture	Hout in verzamelcontainer (Renewi), Non Ferro de Roeck, glas naar vlakglas
																			Vlakglas		Het geredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar
																			Roeck		het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.
																					Metalen (ijzer, koper, aluminium): volledig gerecycled tot nieuwe metalen.
																					Het glas wordt afgevoerd naar vlakglas en zal worden omgesmolten tot nieuw glas en volledig
																					worden hergebruikt in een ander product.
Diverse bevestigingsmaterialen	13	Non Ferro	Boven plafond	Geklemd	300	m2	0,55	165	0,165	0,4			X	0,4					Roeck	4 Remanufacture	naar de Roeck
																					Metalen (ijzer, koper, aluminium): volledig gerecycled tot nieuwe metalen.
Radiatoren	14	Non Ferro	Aan gevel	Geschroefd	1	st	165	165	0,165	0,4			X	0,4					Roeck	4 Remanufacture	naar de Roeck
																					Metalen (ijzer, koper, aluminium): volledig gerecycled tot nieuwe metalen.
Kastenwanden	15	Hout	wand	Geschroefd	37,93	m2	30	1137,9	1,1379	1,1379			X	1,1379					Renewi	4 Remanufacture	Verzamelcontainer Hout op werf naar Renewi gegaan.
																					Het geredderd hout zal worden gebracht naar fabrikanten waar
																					het hout zal worden gerecycled tot spaanplaat en pallets.
Metalen omranding	16	Non Ferro	Beg grond	Gelijmd	53,43	m	0,5	26,715	0,02672	0,13			X	0,13					Roeck	4 Remanufacture	naar de Roeck
																					Metalen (ijzer, koper, aluminium): volledig gerecycled tot nieuwe metalen.

Directie Foekens sloopcombinatie
d.d. 28-10-2025



Productthergebruik 6,27 H recycling 11,72 Recycling 0,00 Verbranding 1,42

Productthergebruik	6,27	32
H recycling	11,72	60
Recycling	0,00	0
Verbranding	1,42	7
	19,40	100
Percentage > recycling		93
