

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Putman Sloopwerken en Infra B.V.

IJsseldijk 3-7
6931 AA WESTERVOORT
Postbus 27
6930 AA WESTERVOORT
Telefoon: +31 (0)26 31 12 151
E-mail: info@putmangroep.com
Website: www.putmangroep.com
KvK-nummer 09050049

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-117/9 is vastgesteld dat Putman Sloopwerken en Infra B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.


De facultatieve projectverificatie voor het project Zwembad de Hoevert, Kerkstraat 49 te Didam heeft plaatsgevonden op 1 en 2 november 2022 alsmede 14 februari 2023 in opdracht van Gemeente Montferland.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.


Namens SGS Nederland B.V.



ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment
Datum: 30 mei 2023



Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.

Stoffenverantwoording “Zwembad de Hoevert”




Putman Sloopwerken en Infra B.V.

IJsseldijk 3-7

Postbus 27 6930AA Westervoort

Directie Sloopadviseurs:

*Sloopadviseur
Doorgesonden en akkoord.*

John Thekoven

17 januari 2023

versie 1.3.1

Directie vertegenwoordiger Putman:

S.J.E. Putman




Grondstofstromen

Beton (producten) zijnde constructie beton van objecten

Resultaatsverplichtheid: 1691 ton

Mate van Hergebruik: Verwerken tot secundaire grondstof of tot oorspronkelijke grondstof.

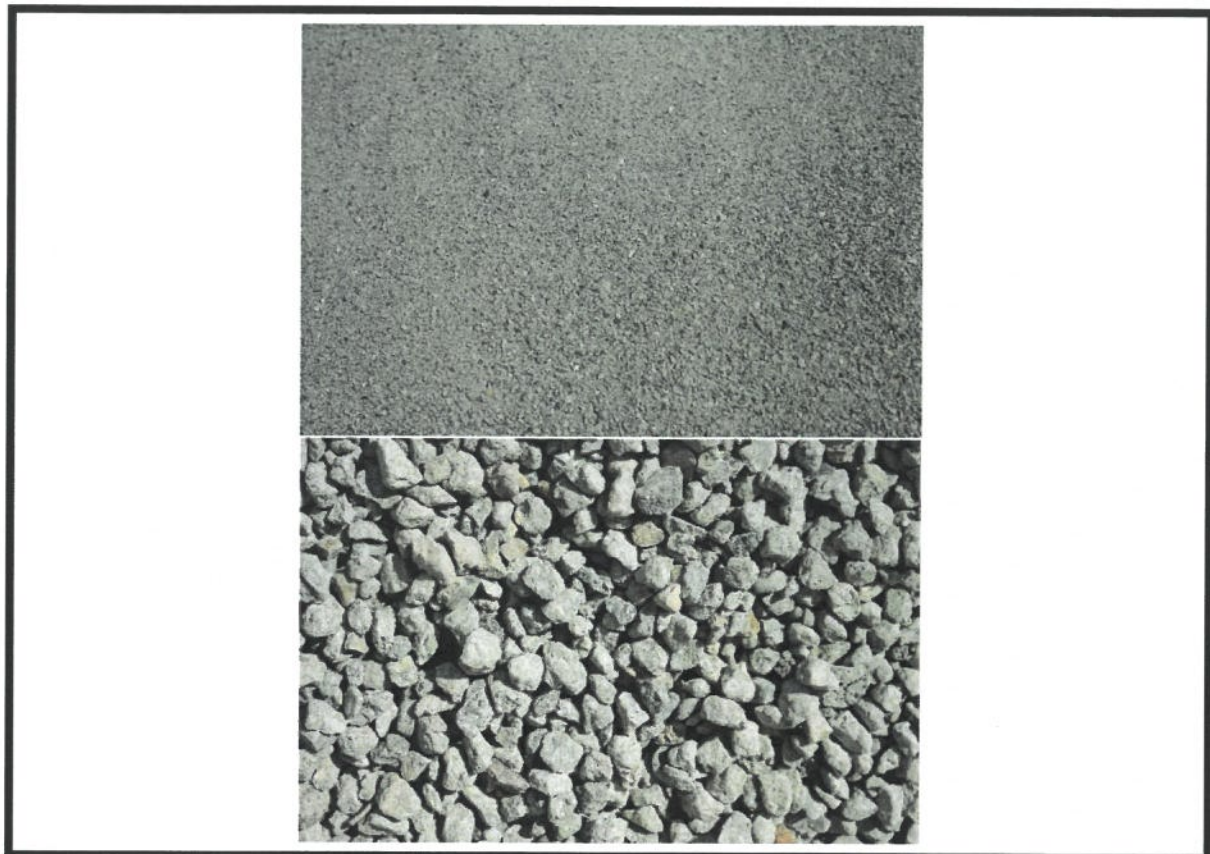

Daadwerkelijke hoeveelheden: 721 ton

Verwerker: Putman Recycling

Eindverwerker: Mebin & Putman recycling


Afwijking: Minder schone betonpuin dan berekent. Door beperkte ruimte op de slooplocatie is meer gemengde puin dan verwacht terecht gekomen tussen de schone betonpuin waardoor de puin niet meer als schone betonpuin geaccepteerd mag worden.

Grondstofstromen

Gemengd puin

Resultaatsverplichtheid: 601 ton

Mate van Hergebruik: Verwerken tot granulaat.

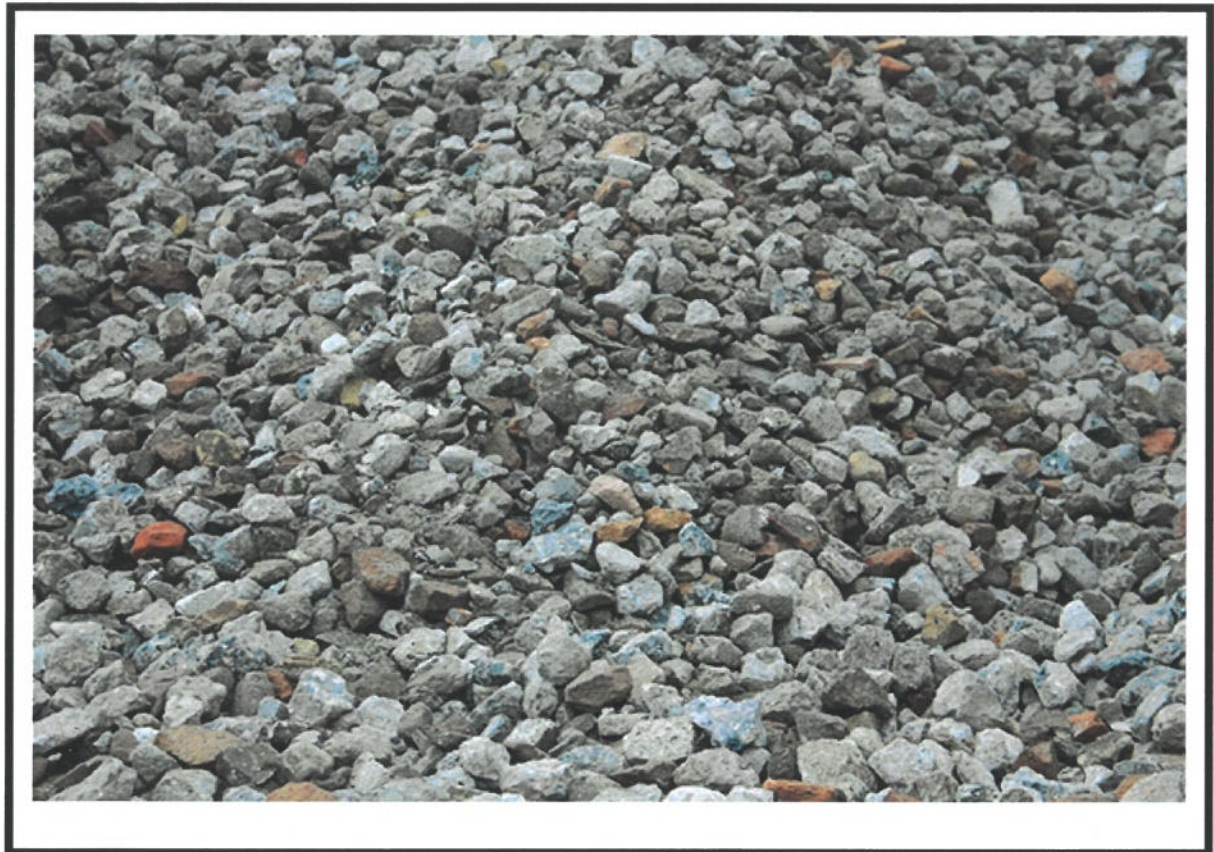

Daadwerkelijke hoeveelheden: 1778 ton

Verwerker: Putman Recycling

Eindverwerker: Civiele verwerkers & Putman Sloopwerken en Infra

Afwijking: Minder schone betonpuin dan berekent. Door beperkte ruimte op de slooplocatie is meer gemengde puin dan verwacht terecht gekomen tussen de schone betonpuin waardoor de puin niet meer als schone betonpuin geaccepteerd mag worden.

Grondstofstromen

B-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld)

Resultaatsverplichtheid: 40 ton

Mate van Hergebruik: Verwerken tot secundaire grondstof.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 25.52 ton

Verwerker: Putman Recycling

Eindverwerker: (Splaanplaatindustrie)


Afwijking: De tonnage hout ligt veel lager dan berekend. Dit komt doordat het grootste deel van het hout op hoge mate voor hergebruikt is verkocht.

Grondstofstromen

Glas

Resultaatsverplichtheid: 2 ton

Mate van Hergebruik: Verwerken tot secundaire grondstof of tot oorspronkelijke grondstof.

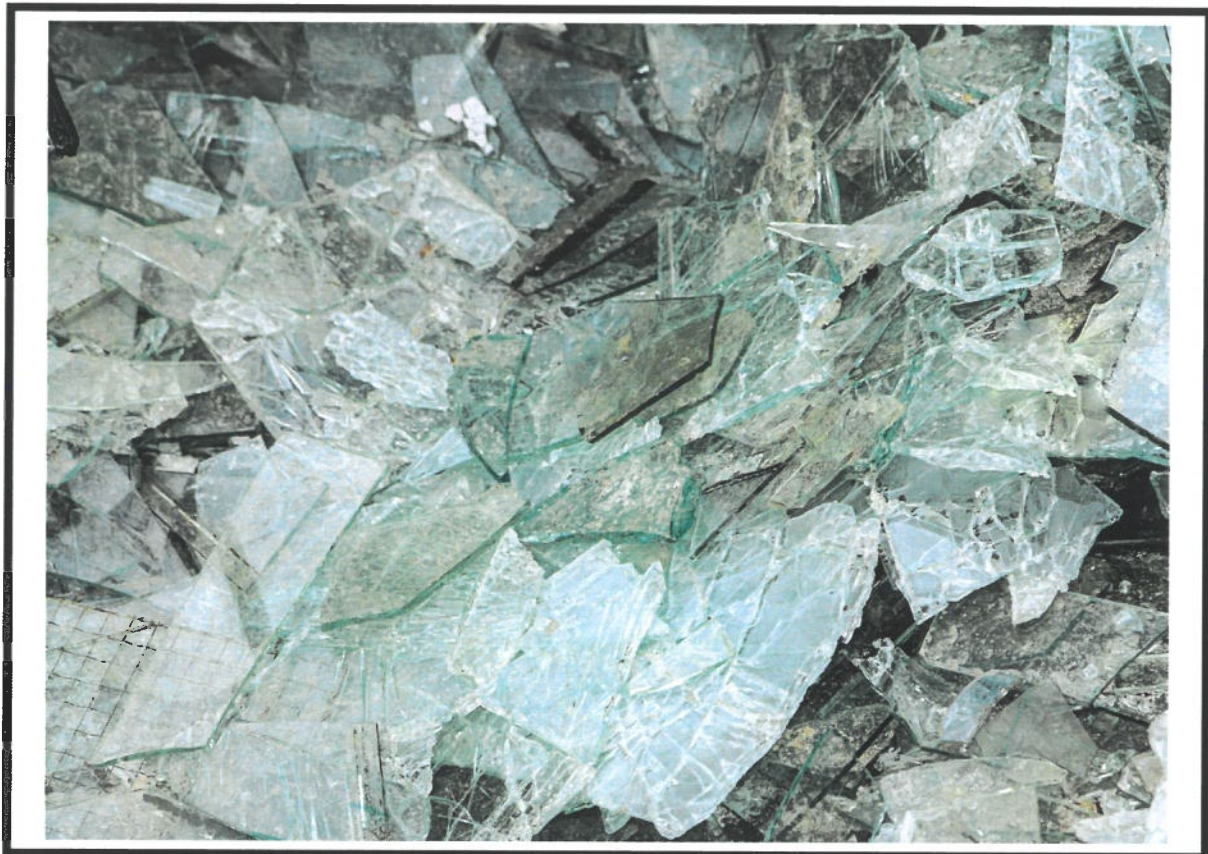

Daadwerkelijke hoeveelheden: 0 ton

Verwerker: Putman Recycling

Eindverwerker:

Afwijking: De beperkte hoeveelheid glas is door het mengpuin heen gewerkt.

Grondstofstromen

Dakafval

Resultaatsverplichtheid: 18 ton

Mate van Hergebruik: Verwerken tot secundaire grondstof.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 73,46 ton

Eindverwerker: Biturec & Rubber verwerking Nederland

Afwijking: De verwachting was dat het dakafval beter te scheiden was, tijdens de werkzaamheden is ondervonden dat dit helaas niet ging en is dus alle dakafval als vervuild dakafval afgevoerd.

Grondstofstromen

Restafval

Resultaatsverplichtheid: 100 ton

Mate van Hergebruik: Verwerken tot secundaire grondstof.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 94,86 ton

Eindverwerker: Putman Recycling

Grondstofstromen

Ferro

Resultaatsverplichtheid: 50 ton

Mate van Hergebruik: Verwerken tot secundaire grondstof.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 46 ton

Eindverwerker: Jansen recycling

Grondstofstromen

Non Ferro

Resultaatsverplichtheid: 2 ton

Mate van Hergebruik: Verwerken tot secundaire grondstof.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 7 ton

Eindverwerker: Van Houtum

Oogsten materialen

Verlichtingsarmaturen

Resultaatsverplichtheid: 85 stuks

Mate van Hergebruik: Verwerken tot secundaire grondstof of tot oorspronkelijke grondstof.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 15 stuks (veel lampen waren al verwijderd)

Eindverwerker: Wecycle

Oogsten materialen

Houten balken (gordingen)

Resultaatsverplichtheid: 350 meter

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 800 m¹

Overgenomen door: Brima Handel Wehl

Afwijking: Er zijn veel meer balken in goede staat uit het pand gehaald dan van te voren gedacht, hierdoor hebben wij ze in hogere mate kunnen hergebruiken en dus meer meters balkhout afgevoerd.

Oogsten materialen

Houten gelamineerde spanten

Resultaatsverplichtheid: 12 stuks

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 12 stuks

Overgenomen door: Brima Handel Wehl

Oogsten materialen

Glijbaan

Resultaatsverplichtheid: 1 stuk

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: Buiten gedeelte van de glijbaan

Overgenomen door: Particulier

Afwijking: De gehele baan was te veel en te groot om mee te nemen.

Oogsten materialen

Glijbaan trap

Resultaatsverplichtheid: 1 stuk

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 1 stuk

Overgenomen door: Brima Handel Wehl

Oogsten materialen

Stalen regenpijp

Resultaatsverplichtheid: 4 stuks

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 0 stuks

Overgenomen door: Zijn verloren gegaan in de sloop van de bovenbouw..

Oogsten materialen

Electrische schuifdeur

Resultaatsverplichtheid: 1 stuk

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 1 stuk

Overgenomen door: Brima Handel Wehl

Oogsten materialen

Stalen draaipoort

Resultaatsverplichtheid: 1 stuk

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 0 stuks

Overgenomen door: Poort incompleet doordat aansluiting van het hekwerk moest blijven staan..

Oogsten materialen

Fietsenbeugels

Resultaatsverplichtheid: 16 stuks

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 16 stuks


Overgenomen door: Brima Handel Wehl

Oogsten materialen

Grote kapstok

Resultaatsverplichtheid: 1 stuk

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.

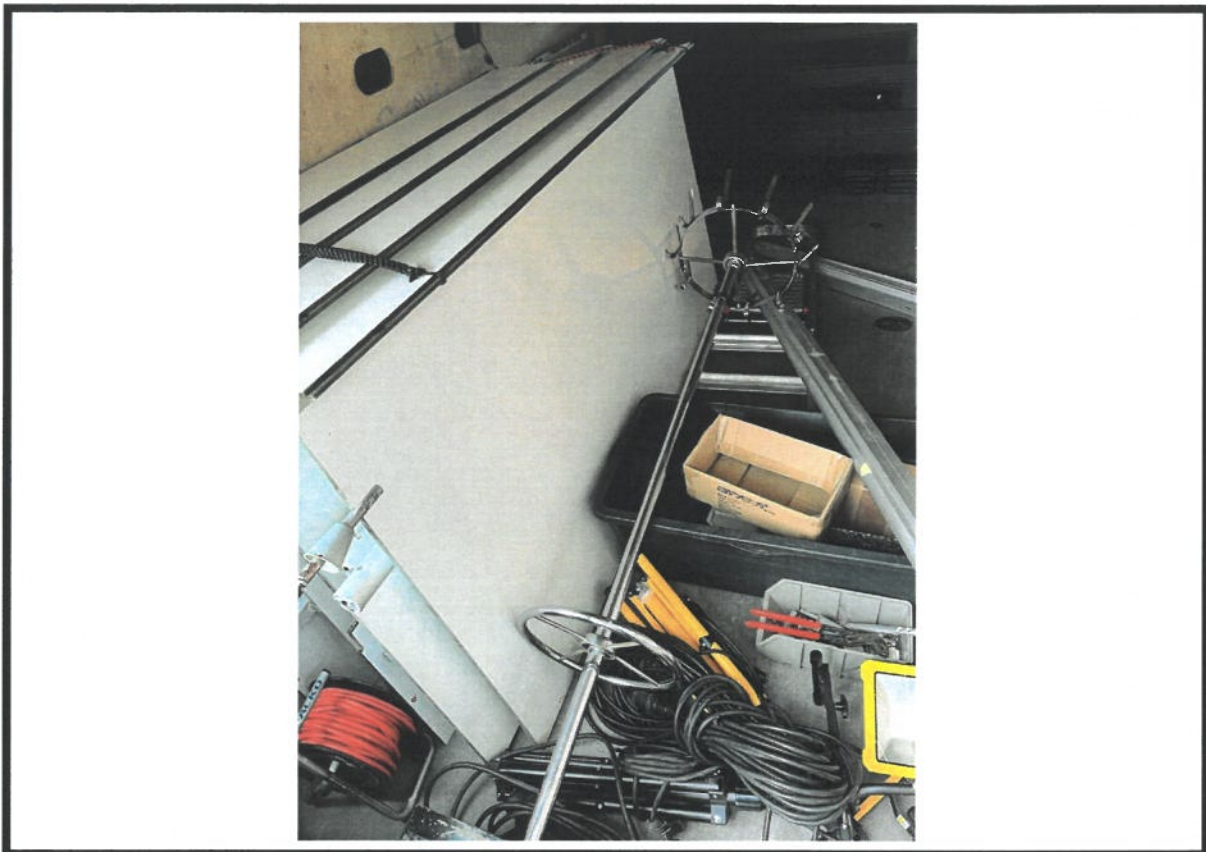

Daadwerkelijke hoeveelheden: 1 stuk


Overgenomen door: Particulier

Oogsten materialen

Wc hokjes

Resultaatsverplichtheid: 1 blok

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.

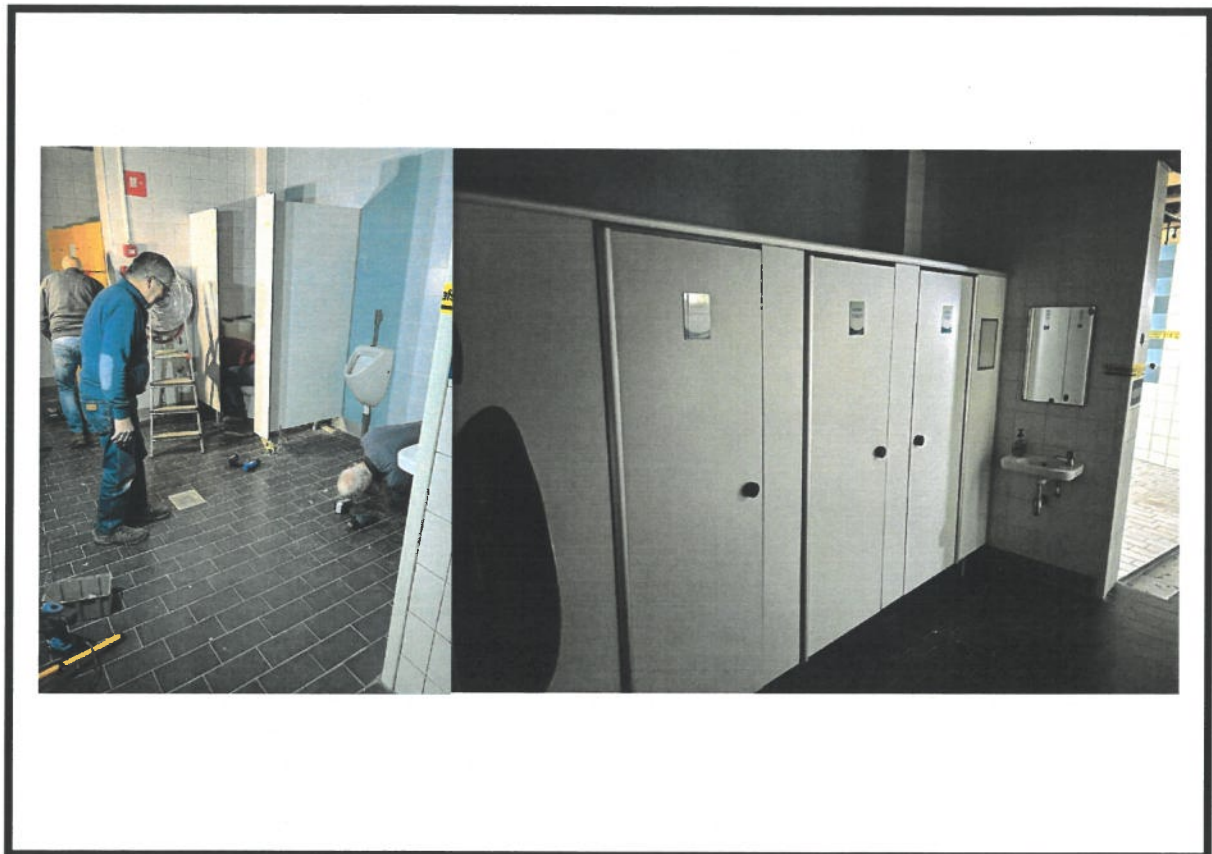

Daadwerkelijke hoeveelheden: 1 blok

Overgenomen door: Particulier

Oogsten materialen

Stalen trap (ketelruimte)

Resultaatsverplichtheid: 1 stuk

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 0 stuk


Overgenomen door: Teveel beschadigd voor verkoop

Oogsten materialen

Kapstokken

Resultaatsverplichtheid: 5 stuks

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.

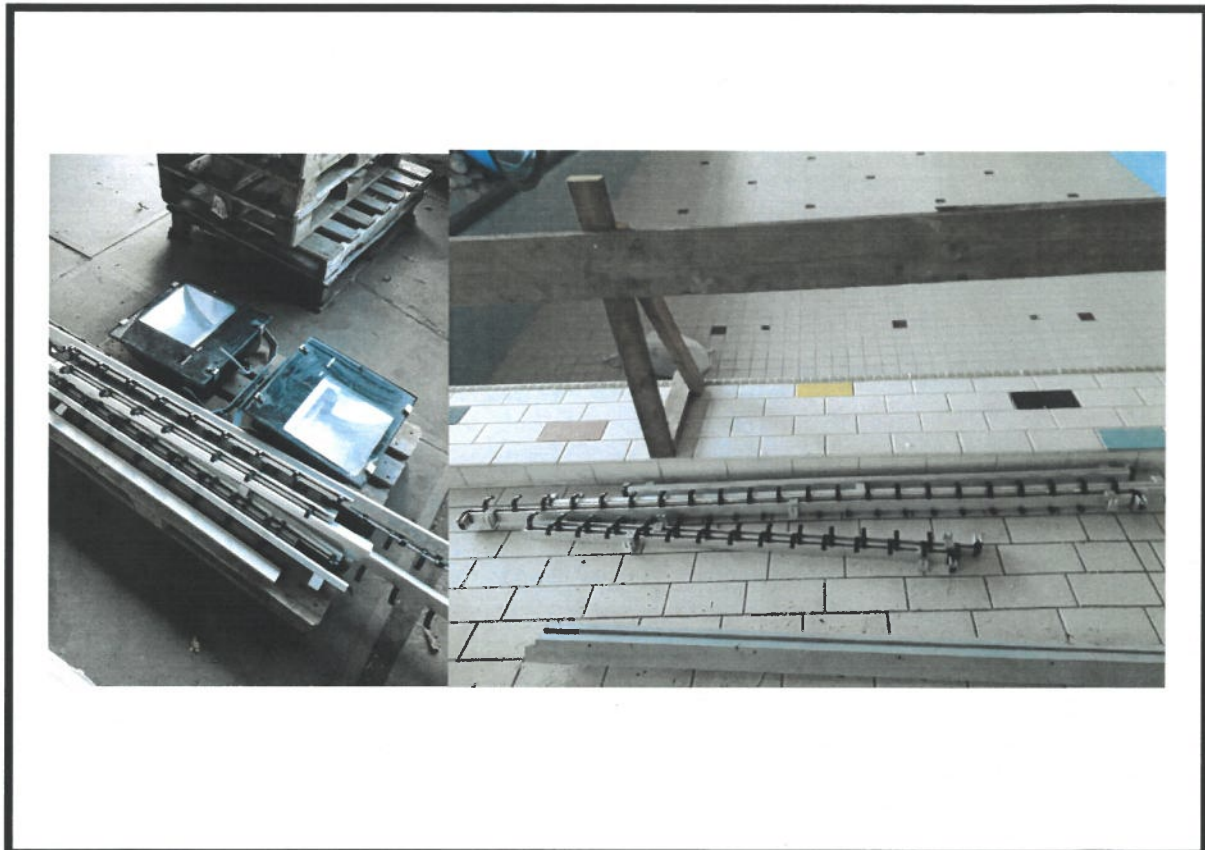

Daadwerkelijke hoeveelheden: 7 stuks

Overgenomen door: Brima Handel Wehl

Oogsten materialen

Binnen deuren

Resultaatsverplichtheid: 6 stuks

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 6 stuks

Overgenomen door: Brima Handel Wehl

Oogsten materialen

Bestrating

Resultaatsverplichtheid: 52 m²

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.



Daadwerkelijke hoeveelheden: 52 m²


Overgenomen door: Brima Handel Wehl

Oogsten materialen

Lampen

Resultaatsverplichtheid: 14 stuks

Mate van Hergebruik: Hergebruik van het product.

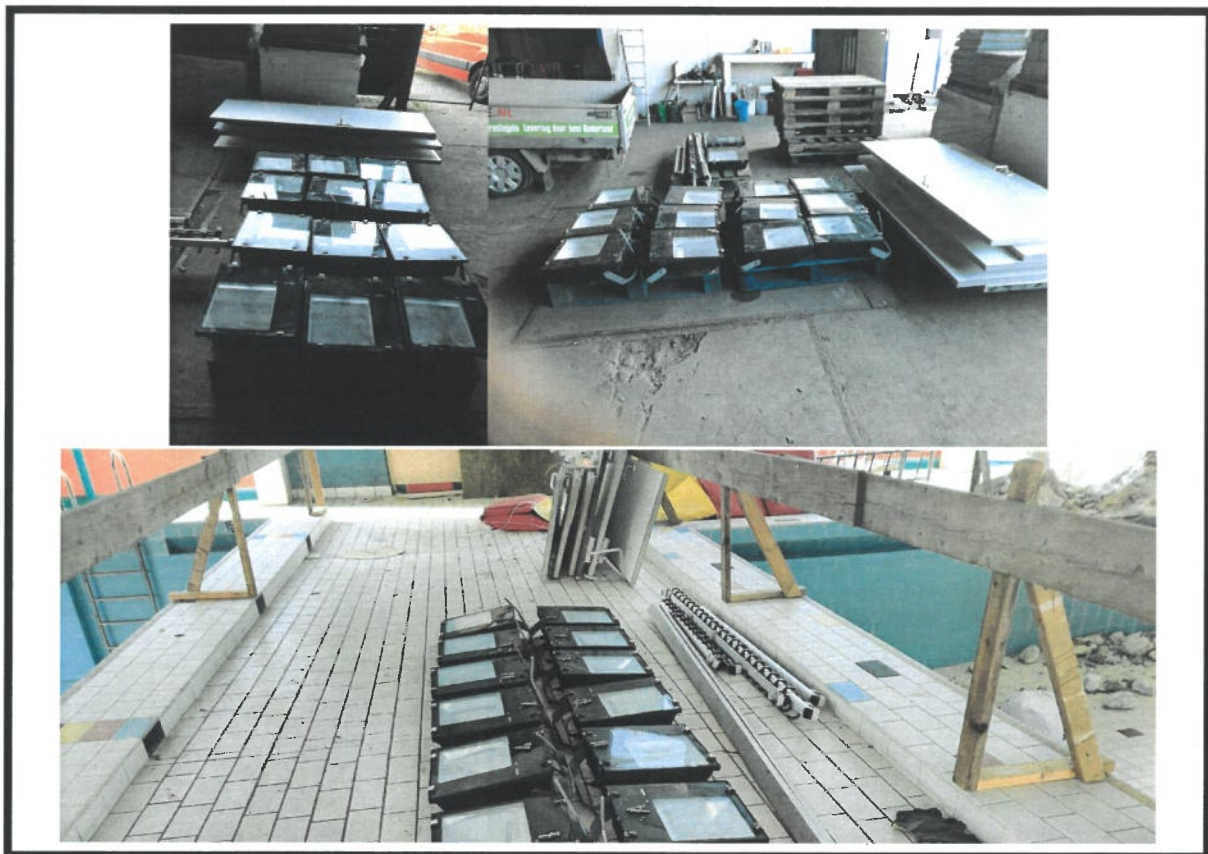

Daadwerkelijke hoeveelheden: 14 stuks

Overgenomen door: Brima Handel Wehl
