

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

Boy Limmen Sloopwerken B.V.

Adres:	Buys Ballotstraat 8	KvK-nummer:	37143242
	1704 SK HEERHUGOWAARD	E-mail:	info@boylimmen.nl
Telefoonnr:	+31 72 571-3989	Website:	http://boylimmen.nl/

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0035 is vastgesteld dat Boy Limmen Sloopwerken B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project 3KWARTIER heeft plaatsgevonden in de periode van 01-09-2023 t/m 01-02-2024 in opdracht van PRO6 Vastgoed.


Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 03-12-2024



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen. Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

**KLEINE EN GROTE DADEN,
ELK TWEEDE LEVEN MAAKT
HET VERSCHIL.**




CIRCULAIR SLOOPPROJECT

“3KWARTIER”

DE BEHAALDE RESULTATEN.

UITVOERING: AUG '23 / FEB '24

INDUSTRIESTRAAT 9 - 11
HANDELSSTRAAT 2
HEERHUGOWAARD

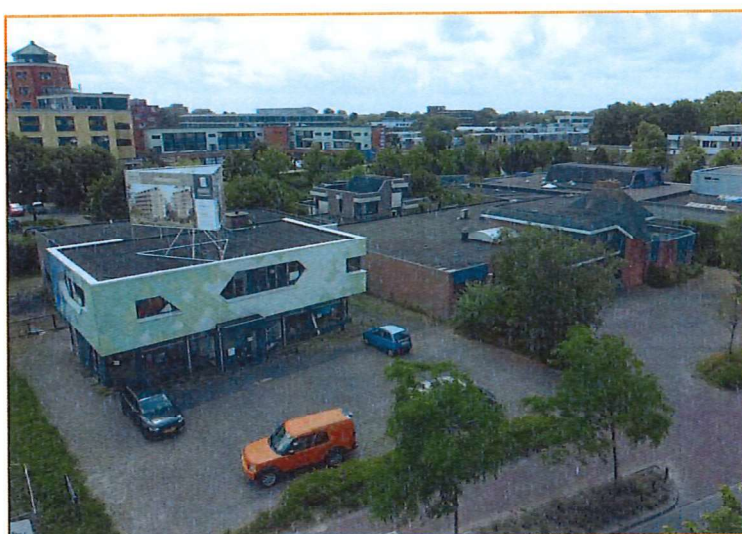

YOB
LIMMEN
SLOOPWERKEN &
ASBESTSANERING

BOY LIMMEN SLOOPWERKEN B.V.

In de transitie van slopen naar demonteren van panden, veranderd ook onze werkwijze. Het is onze intrinsieke motivatie om de materialen op een juiste wijze los te maken waardoor hergebruik mogelijk is. Om met een scherp en reflecterend oog naar de werkwijze te kijken, zijn wij ervan overtuigd onze werkwijze toekomstgericht te ontwikkelen. Daarom hebben wij dit project ook laten certificeren. Met de gecertificeerde reflectie, de kennis van ons team en het netwerk van 'de HEREN van DEMONTEREN', zijn wij ervan overtuigd om het verschil te kunnen maken.

In de onderstaande kolom is te zien welke materiaal stromen er uit de panden zijn gekomen en wat de bestemming is.

PRODUCT / MATERIAAL	EEENHEID	HERGEBRUIK VORM
METSELSTENEN	16 TON	Hergebruik op andere locatie door partner.
PLAFONDSCHROTEN	100 M ²	Verwerking tot circulair kratje door partner.
RUBBER TEGELS	20 M ²	Hergebruik op andere locatie door partner.
PLATAAN BOOM	1 STUKS	Hergebruik op andere locatie door partner.
HEKWERK	5 METER	Hergebruik op andere locatie door particulier.
SCHOMMEL BINNEN	2 STUKS	Hergebruik op andere locatie door partner.
CONSTRUCTIEBALKEN	825 M ¹	Spijkervrij maken, sorteren en toepassen in nieuw project.
GEVELKOZIJNEN	5 TON	Verwerking tot lamellen voor productie nieuwe profielen.
HOUTEN TRAP	2 STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
ISOLATIEMATERIAAL	100 M ²	Hergebruik op andere locatie door partner.
LINOLEUM	100 M ²	Test verwerking circulair grondstof marmoleum.
VLOERVERWARMINGSVERDELER	1 STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
BUREAU	1 STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
CONVECTORPUT ROOSTER	10 STUKS	Refurbish als sokkel voor kunst door partner.
KEUKEN	1 STUKS	Hergebruik op andere locatie door partner.
TOILET MET ACHTERWAND	4 STUKS	Hergebruik op andere locatie door partner en particulier.
URINOIR MET SPOELER	2 STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
WASTAFEL	2 STUKS	Gedemonteerd en opgeslagen in de loods voor verkoop.
WASTAFEL	1 STUKS	Hergebruik op andere locatie door partner.
WASTAFEL MET MEUBEL	2 STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
GIPSPLATEN	100 M ²	Hergebruik op andere locatie door partner.
PLAFONDPLATEN	200 M ²	Hergebruik op andere locatie door partner.
KASTENWAND PLAATMATERIAAL	29 M ²	Hergebruik op andere locatie door partner.
UNDERLAYMENT PLAATMAT.	160 M ²	Hergebruik op andere locatie door partner.
COMMODE / VERSCHOONTAFEL	1 STUKS 1 STUKS	Hergebruik op andere locatie; Hergebruikt voor samengesteld timmerpaneel.
COMPOSIT KEUKENBLAD	2 STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.

SPIROBUIJS	18	M ¹	Hergebruik op andere locatie door partner.
HANGLAMPEN	9	STUKS	Hergebruik op andere locatie door partner.
SCHAKELMATERIAAL	30	STUKS	Hergebruik op andere locatie door partner.
WITGOED APPARATUUR	15	STUKS	Hergebruik op andere locatie door partner.
TERRASTEGELS	62,5	M ²	Gedemonteerd en opgeslagen in de loods voor nieuw project.
BUITENDEUREN	14	STUKS	Hergebruik op andere locatie & als grondstof voor nieuwe profielen gebruikt.
GASHAARD	1	STUKS	Gedemonteerd en opgeslagen in de loods voor verkoop.
LAADPAAL	1	STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
ZONNEPANELEN SYSTEEM	12	STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
TRAPTREDEN MERANTI	60	STUKS	Hergebruik op andere locatie door partner en particulier. Deels opgeslagen voor verwerking in kozijn profielen.
STALEN DOCUMENTKAST	2	STUKS	Refurbish door partner.
COMPUTERKAST LAAGMODEL	1	STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
EETKAMERSTOELEN	4	STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
WIFI ROUTER	1	STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
LATTENBODEM 70 CM BREED	2	STUKS	Hergebruik op andere locatie door particulier.
B-HOUT	30	TON	Verwerking tot grondstof voor plaatmateriaal.
BSA Niet-recyclebaar	22	TON	Verwerking: ontijzerd en verbranding restwarmte en elektriciteit. Hoog aantal door brand in het gebouw.
BSA sorteerbaar	60	TON	Verwerking door verkleining en sortering op herbruikbare grondstoffen.
DAKAFVAL	22	TON	Verwerking door erkende bitumen verwerker.
MENGPUIN	0,5	TON	Verwerking van laatste stukjes steen en bestrating op het terrein.
ORGANISCH AFVAL	32,5	TON	Verwerking middels shredder om te composteren.
VLAAGLAS	1,6	TON	Verwerking tot grondstof nieuw glas.
METAAL RECYCLING	18,5	TON	Verwerking tot grondstof nieuw staal.
MENGGRANULAAT	2.040	TON	Verwerking tot terrein verharding op locatie.
KALKZANDSTEEN	18	TON	Verwerking tot grondstof nieuwe kalkzandsteen.
ASBEST	1,3	TON	Verwerking door erkende stortlocatie.



Heerhugowaard || 19 november 2024
Maarten Lemmens Honig

