

# Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

**Revoort B.V.**

Noorderkijl 10  
9571 AR 2<sup>E</sup> EXLOËRMOND  
Telefoon +31 599 67 15 98  
E-mail: info@revoort.nl  
Website: www.revoort.nl  
Kamer van Koophandel nummer 83379223

## Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-466 is vastgesteld dat Revoort B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project OSG Winkler Prins College Veendam heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2023, 23 november 2023 en 13 juni 2025 in opdracht van gemeente Veendam.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.




ing. L.J.M. Grannetia  
Certificatiemanager Industries & Environment  
Datum: 11 juli 2025

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.





## Circulaire Sloop OSG Winkler Prins College te Veendam Stoffenverantwoording

**REVOORT** • CIRCULAIR  
SLOPEN &  
SAHEREN

|                                              | Werkelijk<br>afgevoerd en<br>hergebruikt | Eenh. | Hoeveelheid<br>direct hergebruik<br>R3-R7 | Eenh. | Hoeveelheid<br>hoopwaarde<br>reycling R8 | Eenh. | Hoeveelheid<br>overig R8 - R10<br>(afgevoerd)<br>C0-9 | Eenh. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>GRONDSTOFFEN BRL SVHS007</b>              |                                          |       |                                           |       |                                          |       |                                                       |       |
| Beton(puin)                                  | 2121,80                                  | ton   |                                           | ton   | 2.121,80                                 | ton   | -                                                     | ton   |
| Metaalwerk(puin)                             | 4953,00                                  | ton   |                                           | ton   | 4.953,00                                 | ton   | -                                                     | ton   |
| Afvalpuin                                    |                                          | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Mengpuin                                     | 301,08                                   | ton   |                                           | ton   | 301,08                                   | ton   | -                                                     | ton   |
| Kalkaanbaten                                 | 4296,16                                  | ton   |                                           | ton   | 4.296,16                                 | ton   | -                                                     | ton   |
| Oplosmiddel materiaal                        | 43,26                                    | ton   |                                           | ton   | 43,26                                    | ton   | -                                                     | ton   |
| Gebouwen                                     |                                          | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| A-hout                                       | 127,88                                   | ton   |                                           | ton   | 127,88                                   | ton   | -                                                     | ton   |
| B-hout                                       |                                          | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| C-hout                                       | 11,05                                    | ton   |                                           | ton   | 11,05                                    | ton   | -                                                     | ton   |
| Non-ferromagnetische metalen                 | 393,09                                   | ton   |                                           | ton   | 393,09                                   | ton   | -                                                     | ton   |
| Ferromagnetische metalen                     |                                          | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Glas                                         |                                          | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Vloerbedekking                               |                                          | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Isolatie materiaal                           |                                          | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Dakbedekkingmateriaal bitumineus             | 23,68                                    | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | 23,68                                                 | ton   |
| Dakbedekkingmateriaal teerhoudend            |                                          | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Gemengd bouw- en sloopafval                  | 184,61                                   | ton   |                                           | ton   | 186,15                                   | ton   | 18,46                                                 | ton   |
| Kunststoffen                                 |                                          | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| <b>PRODUCTHERGEBRUIK Gerecycled</b>          |                                          |       |                                           |       |                                          |       |                                                       |       |
| 10 houten balken                             | 0,30                                     | ton   | 0,30                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 15 houten balken                             | 0,30                                     | ton   | 0,30                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 15 houten balken                             | 0,30                                     | ton   | 0,30                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Puilen balken                                | 36,78                                    | ton   |                                           | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| H balken 2 stuks                             | 0,24                                     | ton   | 0,24                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 1 I-panen balk                               | 0,15                                     | ton   | 0,15                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| ca. 20000 tegelbestrating                    | 190,00                                   | ton   | 190,00                                    | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| ca. 1500 tegelbestrating                     | 14,00                                    | ton   | 14,00                                     | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Deur met kozijn                              | 0,20                                     | ton   | 0,20                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 8 aluminium kozijn                           | 0,60                                     | ton   | 0,60                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| afzetwielplaat 150 stuks                     | 0,15                                     | ton   | 0,15                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 15 stuks damwandplaten                       | 1,50                                     | ton   | 1,50                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| ca. 14000 straatstenen                       | 35,00                                    | ton   | 35,00                                     | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Schredder aluminium                          | 3,74                                     | ton   | 3,74                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Kunstwerk van de Ploeg                       | 20,00                                    | ton   | 20,00                                     | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 2 Dormenten                                  | 0,80                                     | ton   | 0,80                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 2 Trappen                                    | 0,80                                     | ton   | 0,80                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 6 stuken hekwerk                             | 0,60                                     | ton   | 0,60                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Groot betonnen WP vogels 9 stuks             | 0,27                                     | ton   | 0,27                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 11 kastenbord borden                         | 0,60                                     | ton   | 0,60                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 13 Priborden                                 | 0,13                                     | ton   | 0,13                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| ca. 1100m2 dakpannen                         | 45,00                                    | ton   | 45,00                                     | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| gafels die oude eerste school hout           | 20,00                                    | ton   | 20,00                                     | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 795 Wandcontactdozen                         | 0,08                                     | ton   | 0,08                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 155 Brandmelders                             | 0,08                                     | ton   | 0,08                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 123 Contactdozen                             | 0,02                                     | ton   | 0,02                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 21 Alarmmelders                              | 0,01                                     | ton   | 0,01                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 42 Speakers                                  | 0,01                                     | ton   | 0,01                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 132 Spijlen klein en groot                   | 0,03                                     | ton   | 0,03                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| 61 Nooduitgang borden                        | 0,01                                     | ton   | 0,01                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |
| Dieren - groepenkast - cv ketel - brandslang | 0,50                                     | ton   | 0,50                                      | ton   |                                          | ton   | -                                                     | ton   |

Hoeveelheid vrijgekomen materialen: 12831,45 ton 374,04 ton 12415,27 ton 42,14 ton

Percentage circulariteit: 99,67%

Datum: 13-6-2025  
Versie: 2025-2

Handtekening Directie:  
*G. Hoiveld*  
G. Hoiveld  
Commercieel Directeur

REVOORT  
info@revoot.nl  
www.revoot.nl

Noorderkijl 10  
9571AR Tweede Exloermond  
0599 671598


**REVOORT** • CIRCULAIR  
SLOPEN &  
SAHEREN

REVOORT  
info@revoot.nl  
www.revoot.nl

Noorderkijl 10  
9571AR Tweede Exloermond  
0599 671598

## Circulaire Sloop OSG Winkler Prins College te Veendam Stoffenverantwoording

| Totaal                                | Compos.  | Percentage van het totale<br>hoeveelheid |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| Hoeveelheid direct hergebruik R3-R7   | 374,04   | 2,92%                                    |
| Hoeveelheid hoopwaarde reycling R8    | 12415,27 | 96,76%                                   |
| Hoeveelheid overig (afgevoerd) R8-R10 | 42,14    | 0,32%                                    |
| Totaal                                | 12831,45 | 100,00%                                  |

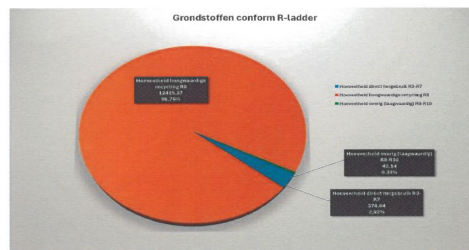

| GRONDSTOFFEN BRL SVHS007         | Werkelijk afgevoerd en hergebruikt (per ton) | Hoeveelheid hoopwaarde reycling (per ton) | % R3-R7 | Hoeveelheid overig R8 - R10 (afgevoerd) (per ton) | % R8-R10 | Percentage hoopwaarde direct | Percentage hoopwaarde indirect |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| Beton(puin)                      | 2121,80                                      | 2121,80                                   | 100,00% | 0,00                                              | 0,00%    | 100,00%                      | 0,00%                          |
| Metaalwerk(puin)                 | 4953,00                                      | 4953,00                                   | 100,00% | 0,00                                              | 0,00%    | 100,00%                      | 0,00%                          |
| Afvalpuin                        | 301,08                                       | 301,08                                    | 100,00% | 0,00                                              | 0,00%    | 100,00%                      | 0,00%                          |
| Kalkaanbaten                     | 4296,16                                      | 4296,16                                   | 100,00% | 0,00                                              | 0,00%    | 100,00%                      | 0,00%                          |
| Oplosmiddel materiaal            | 43,26                                        | 43,26                                     | 100,00% | 0,00                                              | 0,00%    | 100,00%                      | 0,00%                          |
| A-hout                           | 127,88                                       | 127,88                                    | 100,00% | 0,00                                              | 0,00%    | 100,00%                      | 0,00%                          |
| Non-ferromagnetische metalen     | 393,09                                       | 393,09                                    | 100,00% | 0,00                                              | 0,00%    | 100,00%                      | 0,00%                          |
| Ferromagnetische metalen         |                                              |                                           |         | 0,00                                              | 0,00%    | 100,00%                      | 0,00%                          |
| Dakbedekkingmateriaal bitumineus | 23,68                                        | 0,00                                      | 0,00%   | 23,68                                             | 100,00%  | 0,00%                        | 100,00%                        |
| Gemengd bouw- en sloopafval      | 184,61                                       | 186,15                                    | 100,00% | 0,00                                              | 0,00%    | 100,00%                      | 0,00%                          |

Handtekening Directie:

*G. Hoiveld*  
G. Hoiveld  
Commercieel Directeur

| POEDEL PRODUCTHERGEBRUIK                     | Werkelijk afgevoerd en hergebruikt (per ton) | Hoeveelheid direct hergebruik R3-R7 | percentage hoopwaarde direct | percentage hoopwaarde indirect | percentage |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| 10 houten balken                             | 0,30                                         | 0,30                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 15 houten balken                             | 0,30                                         | 0,30                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 15 houten balken                             | 0,30                                         | 0,30                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| Puilen balken                                | 36,78                                        | 36,78                               | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 12 balken 2 stuks                            | 0,24                                         | 0,24                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 1 I-panen balk                               | 0,15                                         | 0,15                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| ca. 20000 tegelbestrating                    | 190,00                                       | 190,00                              | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| ca. 1500 tegelbestrating                     | 14,00                                        | 14,00                               | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| Deur met kozijn                              | 0,20                                         | 0,20                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 8 aluminium kozijn                           | 0,60                                         | 0,60                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| afzetwielplaat 150 stuks                     | 0,15                                         | 0,15                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 15 stuks damwandplaten                       | 1,50                                         | 1,50                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| ca. 14000 straatstenen                       | 35,00                                        | 35,00                               | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| Schredder aluminium                          | 3,74                                         | 3,74                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| Kunstwerk van de Ploeg                       | 20,00                                        | 20,00                               | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 2 Dormenten                                  | 0,80                                         | 0,80                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 2 Trappen                                    | 0,80                                         | 0,80                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 6 stuken hekwerk                             | 0,60                                         | 0,60                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| Groot betonnen WP vogels 9 stuks             | 0,27                                         | 0,27                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 11 kastenbord borden                         | 0,60                                         | 0,60                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 13 Priborden                                 | 0,13                                         | 0,13                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| ca. 1100m2 dakpannen                         | 45,00                                        | 45,00                               | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| gafels die oude eerste school hout           | 20,00                                        | 20,00                               | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 795 Wandcontactdozen                         | 0,08                                         | 0,08                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 155 Brandmelders                             | 0,08                                         | 0,08                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 123 Contactdozen                             | 0,02                                         | 0,02                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 21 Alarmmelders                              | 0,01                                         | 0,01                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 42 Speakers                                  | 0,01                                         | 0,01                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 132 Spijlen klein en groot                   | 0,03                                         | 0,03                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| 61 Nooduitgang borden                        | 0,01                                         | 0,01                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |
| Dieren - groepenkast - cv ketel - brandslang | 0,50                                         | 0,50                                | 100,00%                      | 0,00%                          | 0,00%      |

